Hoja de Ruta — Consolidación del SDLC IOND

Fases, entregables y responsables para adoptar el SDLC y el rol de QA como Analista de Calidad y Requerimientos

Propuesta por: Steve Nina — Scrum Master IOND
Aplica a: IOND · IonMind · StageMind
Audiencia: Scrum Master · PO · Lead Dev · RM · Lead QA · Stakeholders

1. Objetivo

Pasar del modelo **Dual Track** al **SDLC de IOND**: kanban de **Discovery**, kanban de **Improvements** y **Releases** semanales. En el SDLC, QA asume el rol de **Analista de Calidad y Requerimientos**: redacta la Matriz de Requerimientos y el PO da su VoBo. El plan estandariza el flujo, el gobierno en ClickUp, las métricas y las herramientas de QA (el *QA Catalyst*). La metodología rige **desde su aprobación**.


2. Mapa de documentos

#	Documento	Para quién	Para qué
00	**Hoja de Ruta** (este documento)	Todos	Fases, responsables y criterios de salida
01	**Diagnóstico y Plan de Adecuación del QA Catalyst**	QA · Lead QA · SM	Puntos de quiebre de la herramienta y plan R0–R5
02	**Análisis del Flujo SDLC IOND**	PO · LD · RM · LQA · SM	Estados, responsables, *gates*, RACI y frontera QA ↔ PO ↔ Dev
03	**Registro de Decisiones, Riesgos y Limitaciones**	Todos	Las 55 decisiones del equipo (Q-01 a Q-55), acciones de verificación (AV-xx), riesgos y limitaciones
04	**Acuerdo de Flujo de Trabajo IOND**	Todo el equipo	Acuerdo normativo PO · Development · QA
05	**Estándar Operativo de QA — Aplicación IOND**	QA · LQA · PO	Cómo trabaja QA, matrices, severidad y SLAs
06a	**Guía de Gobierno ClickUp — Scrum Master**	SM	Configuración, tags, automatizaciones, auditoría, ceremonias y ajustes pendientes
06b	**Guía Operativa ClickUp — Development + QA**	Dev · QA	Qué hacer en cada estado y plantillas de comentario
07	**Dashboards y Métricas**	QA · PO · SH · LD · LQA · SM	Diccionario de métricas y dashboards por rol
08	**Guía de Uso del QA Catalyst**	QA · LQA · SM	Cómo invocar las skills del catalyst en cada estado, qué producen y cómo se publican sus salidas
—	**Fuente canónica** `knowledge/L1-project/sdlc-consolidation.md`	Todos / catalyst	Estados, campos, tags, plantillas y automatizaciones (única fuente de verdad)
—	**CSV SDLC** `resources/IOND SDLC - {DISCOVERY,IMPROVEMENTS,RELEASES}.csv`	SM · equipo	Guía tabular por estado (owner, reuniones, entrada, salida, SLA)
—	**Suites del release** `knowledge/test-suites/`	QA · LQA · SM	Smoke maestro, E2E maestro con IDs estables, cobertura y hoja de ruta de automatización

3. Fases

Fase	Objetivo	Entregables	Responsable	Criterio de salida	Duración estimada
F0 · Estandarización documental	Analizar el flujo y el repositorio y proponer el estándar	CSV actualizados, fuente canónica v2, documentos 00–07 (MD + PDF)	SM / QA	Documentos publicados para revisión	Completada (octubre 2026)

Fase	Objetivo	Entregables	Responsable	Criterio de salida	Duración estimada
F1 · Taller de consolidación ✅	Resolver las preguntas Q-xx y aprobar el acuerdo	Registro de decisiones (doc 03 §7), **Acuerdo IOND v1.0** y **Estándar QA IOND v1.0** aprobados, fuente canónica sin críticas	SM facilita · **PO decide** · LD/RM · LQA	Preguntas 🔴 resueltas; acuerdo firmado por PO, LD/RM y LQA	1 semana (2 sesiones de 90 min + asíncrono)
F2b · Plan de pruebas de release ✅	Planificar `smoke`, `sanity` y `regression` y la automatización (Q-32, Q-40)	Estrategia de cuatro suites (Q-47 a Q-51): smoke maestro único, sanity y regresión por versión, E2E maestro como capa 2; E2E maestro con IDs; hoja de ruta de automatización por olas	LQA + QA	Estrategia aprobada el 2026-10-10; automatización del smoke (Ola 1) en curso	Completada (octubre 2026)
F2 · Gobierno ClickUp	Configurar los tableros según el estándar	Orden y tipos de estado, `blocked` en Discovery, tags SDLC, plantillas T-01…T-04, Form de bugs, automatizaciones (oleadas), vistas, dashboards; anexo de ajustes corregido	SM	Tableros alineados y 2 semanas de piloto sin incidencias graves de proceso	2–3 semanas (piloto incluido)
F3 · Adecuación del QA Catalyst	Alinear la herramienta al SDLC	Etapas R0 → R4 del doc 01 (higiene, vocabulario, templates, skills por estado y de release, suites, auditoría y métricas); implementadas en el repositorio el 2026-10-10	QA (con revisión del SM)	Un ticket de Discovery, uno de Improvements y un release recorridos de punta a punta con el catalyst	4–6 semanas (en paralelo a F2/F4)
F4 · Piloto y medición	Estabilizar y medir	Línea base de métricas (3–4 releases semanales), retrospectiva del flujo, **Acuerdo v1.1**	SM + LQA · PO lidera la retro	Metas definitivas fijadas; ajustes incorporados	4 semanas
F5 · Expansión multi-producto	Soporte del catalyst para IonMind y StageMind	Perfiles de producto L1, módulos L2, matrices de release por producto (R5)	QA	Primer release de IonMind o StageMind acompañado por el catalyst	A definir (depende del acceso a repos y conocimiento)

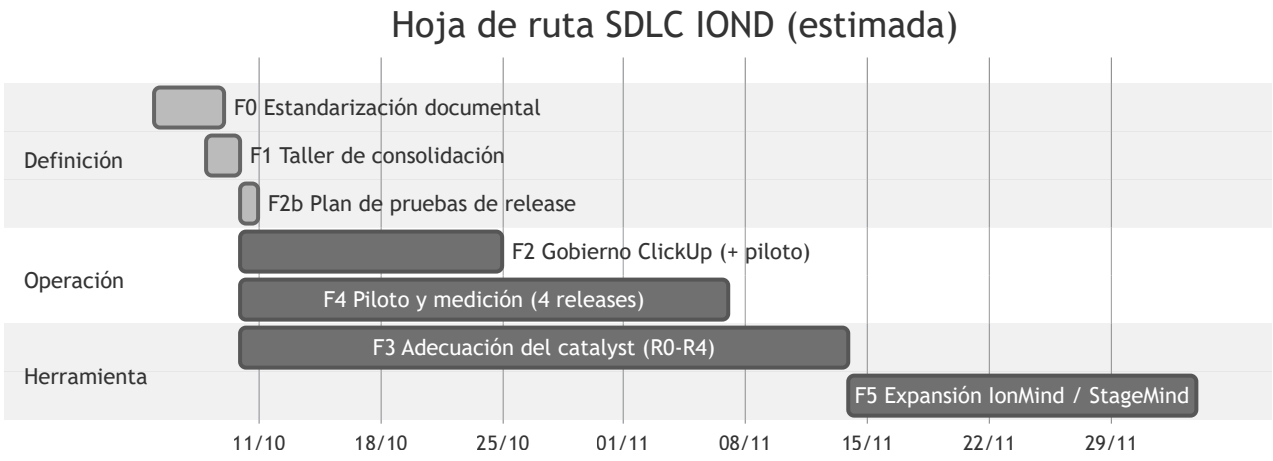

4. Próximos pasos inmediatos

La fase F1 se cerró el **2026-10-09** con las decisiones Q-01 a Q-46 del documento 03, y el plan de pruebas de release (F2b) el **2026-10-10** con Q-47 a Q-54. El **2026-10-11** se sumó Q-55 (el LQA asigna al QA desde `assignment`). Las tareas que siguen son las **acciones de verificación (AV-xx)** del mismo documento:

1. **SM — configurar ClickUp (F2):** estados (`blocked` en Discovery, `to do` a Active, `done w/d` a Done, orden de `uat`), campo **Stagemind.Version**, tags SDLC, plantillas T-01 a T-04 con el checklist de acuse y Form de bugs (AV-04, AV-05). Después, el Anexo A de la guía 06a (AV-06).
2. **SM + PO:** acordar con el SH el día dedicado de la Discovery Review (AV-01).
3. **LD/RM:** inventario de CI por repositorio (AV-02) y ventana fija de despliegue con DevOps (AV-07).
4. **LQA + LD/RM:** crear la **company de prueba en producción** para el smoke post-despliegue (AV-09). **LQA + LD:** definir el flujo representativo de StageMind del smoke (AV-12).
5. **LQA:** entregar al responsable de bot-test los requisitos de la Ola 0 (AV-11) y crear en QA Kanban el ticket de automatización del smoke (Ola 1).
6. **SM:** verificar si ClickUp permite mover las subtareas `done w/d` junto con el padre (A-20, AV-10).
7. **QA:** validar el catalyst adecuado recorriendo un ticket de Discovery, uno de Improvements y el primer release semanal (criterio de salida de F3); commit del trabajo pendiente.
8. **Todos:** usar las plantillas de comentario C-xx (guía 06b y `templates/comments/`).

5. Gobierno del cambio

- **Dueño del estándar:** Scrum Master, junto con el PO para las decisiones de producto.
- **Control de versiones:** la fuente canónica y los documentos viven en el repositorio (`docs/sdlc-iond/`). Todo cambio se versiona (v1.0 → v1.1…) y se comunica en la retrospectiva.
- **Revisión:** al cierre de F4 y luego cada trimestre, o antes si las métricas muestran desvíos (VoBo fuera de SLA, rechazos al alza, releases fuera de calendario).
