Diagnóstico y Plan de Adecuación del QA Catalyst

ionflow-qa-catalyst frente al SDLC IOND

Propuesta por: Steve Nina — Scrum Master IOND
Aplica a: repositorio `ionflow-qa-catalyst` (skills, runbooks, templates y base de conocimiento)
Audiencia: QA · Lead QA · Scrum Master · mantenedores del catalyst

1. Resumen ejecutivo

El QA Catalyst se construyó como un sistema de **conocimiento estructurado (L1 proyecto / L2 módulos / L3 tickets) + skills para agentes de IA** orientado al modelo **Dual Track** (Discovery + Deployment). Con el SDLC (Discovery, Improvements y Releases semanales) y el rol de **QA como Analista de Calidad y Requerimientos**, la herramienta queda desalineada en tres frentes:

1. **Falta la pieza central del nuevo modelo:** no existe ningún artefacto, skill ni control (*gate*) para la **Matriz de Requerimientos con VoBo del PO**. Hoy el primer artefacto obligatorio es la Matriz de Pruebas.
2. **El enrutamiento y los supuestos son del modelo anterior:**
   - Las rutas se arman por "Discovery vs Deployment".
   - La planificación usa sprints 2+1 y estados que ya no existen.
   - Se asume que se prueba sobre `DEVELOPMENT` con el código ya mergeado. En el SDLC, `mock testing` ocurre **antes** del merge y el release se valida sobre la rama RC.
3. **Deuda de mantenimiento:**
   - Referencias rotas.
   - Reglas duplicadas que ya divergen (tres criterios de Go/No-Go, dos esquemas de inyección de casos, cuatro taxonomías de tags).
   - Templates con ambientes desactualizados.
   - Temas de higiene del repositorio.

Este documento lista los **puntos de quiebre (B-xx)** con su ubicación y corrección, define la **arquitectura objetivo** (skills por tablero y estado) y propone un **plan de adecuación en 6 etapas (R0–R5)**. Según lo acordado, el refactor se ejecuta en la **Fase F3**, una vez aprobado el flujo (la fase F1 se cerró el 2026-10-09). La fuente canónica para la adecuación es `knowledge/L1-project/sdlc-consolidation.md` (v2.2). **Las etapas R0 a R4 se implementaron en el repositorio el 2026-10-10**, junto con la nueva estrategia de pruebas del release (`Q-47` a `Q-54`); el estado de cada etapa está en la sección 7.1.

---

2. Qué es el catalyst hoy

Componente	Contenido	Estado frente al SDLC
`SKILL.md` (raíz)	Orquestador: reglas de carga de contexto, 3 stages, *gates* previos, Announce → Confirm → Act, enrutamiento	🔴 Enrutamiento y *gates* de Dual Track
`skills/` (24 archivos)	Runbooks de Discovery y Deployment; test-docs (prioritize, document); sprint-testing (plan, test, report); code-review; automation (plan, code, review); regression (run, analyze, decide); release (ingest, plan, plan-v1, regression-matrix, smoke-matrix, notes, brief, deployment-protocol, bug-hunt); bug-reporter; sprint-planning; knowledge/update-module	🔴/🟠 Reutilizables en su mayoría, pero hay que re-anclarlos a estados
`templates/` (15)	approval, rejection, qa-report, test-matrix, ticket-memory, comment, bug-ticket, architecture-brief-qa, release-* (brief, notes, plan, regression-matrix, smoke-matrix), deployment-protocol, bug-hunt-report	🟠 Ninguno está listo para el SDLC; faltan ~18
`knowledge/L1-project`	business-rules, api-architecture, stack-overview, test-priorities, **sdlc-consolidation (v2.1)**	🟠 stack-overview y test-priorities con conceptos anteriores

Componente	Contenido	Estado frente al SDLC
`knowledge/L2-modules` (15 módulos)	Un `module.md` por módulo (accounts … webhooks)	🟠 Secciones inconsistentes; README y template desactualizados
`knowledge/L3-tickets`	Carpeta por ticket con artefactos de QA	🟠 Convención del README obsoleta; nombres de iteración no estandarizados
`knowledge/releases`	Carpeta por versión	🟠 Sin estructura por producto

---

3. Puntos de quiebre (B-xx)

Severidad: 🔴 bloquea la operación en el SDLC · 🟠 genera errores o confusión · 🟢 mejora.

3.1 Modelo de proceso (Dual Track → SDLC)

ID	Sev.	Punto de quiebre	Ubicación	Corrección
B-01	🔴	**No existe la Matriz de Requerimientos** (ni template, ni skill, ni captura del VoBo del PO, ni REQ-IDs).	Todo el repo (sin coincidencias)	Skill `requirements/` + template `requirements-matrix.md` + gate de VoBo (R2–R3).
B-02	🔴	El *gate* 2 exige `test-matrix.md` y `test-plan.md` antes de **cualquier** skill.	`SKILL.md:84-87`	*Gates* por estado: Matriz de Requerimientos con VoBo antes de `mock testing`.
B-03	🔴	El *gate* 3 pregunta "¿track correcto? (Discovery vs Deployment)". El enrutamiento completo es por track.	`SKILL.md:94`, `:169-319`; `README.md:14`; `skills/README.md:9-49`	Enrutar por **tablero + estado** del ticket (leído vía MCP).
B-04	🔴	`discovery-runbook` termina en `test-matrix` + `test-plan` y mezcla prototipo y requerimientos.	`skills/discovery-runbook.md:249-307`, `:349-366`	Dividirlo en `prototype-review/` (testabilidad y preguntas) y `requirements/` (matriz + VoBo).
B-05	🔴	`deployment-runbook` exige artefactos de Discovery, así que un bug de Improvements no puede probarse.	`skills/deployment-runbook.md:43-50`	Reemplazarlo por `mock-testing/` con dos modos: Discovery (matriz) e Improvements (bug / mini-matriz).
B-06	🔴	No hay runbook de **Improvements** (triage, bug sin matriz, mini-matriz).	—	Skill `improvements-triage/`.
B-07	🔴	`sprint-planning` usa los estados `sprint intake`, `fortification`, `qa testing` y `qa in process`, y el modelo 2+1.	`skills/sprint-planning/SKILL.md:17-29`, `:81-85`, `:161-166`	Retirarlo. Lo reemplaza `release/weekly-plan` (corte semanal).
B-08	🔴	`release/plan` (2+1 semanas, deploy en la semana 3) y `plan-v1` (único uso). Además están en `.gitignore` pero se enrutan.	`skills/release/plan.md:117-148`; `.gitignore:17-18`; `SKILL.md:218,316-319`	Rehacerlo para el release semanal. Versionarlo en git (sin datos privados).

ID	Sev.	Punto de quiebre	Ubicación	Corrección
B-09	🔴	No existe el paso **SANITY** (re-ejecutar los REQ críticos de cada ticket en la RC).	—	Skill `release/sanity`, que agrega las matrices L3 de los tickets del release.
B-10	🟠	"Regresión" significa dos cosas: suite E2E (`regression/*`) y matriz manual (`release/regression-matrix`). El orden del pipeline difiere en tres lugares.	`SKILL.md:300-314`; `skills/README.md:281-282`; `release/plan-v1.md:219-223`	Unificar en `release/regression` (riesgo + cross-system) con el orden smoke → sanity → regression.
B-11	🟠	Ambiente y rama fijos en `DEVELOPMENT` / `dev-app.ionflow.io`; se asume el código ya mergeado.	`sprint-testing/test.md:180-189`; `report.md:240`; `code-review/review.md:61-71`; `regression/run.md:15,95`; templates	Parametrizar: rama del ticket + ambiente QA para `mock testing`; rama RC + preprod para Release.
B-12	🟠	Estado legacy `production deploy` en el protocolo de despliegue.	`skills/release/deployment-protocol.md:105`; `templates/deployment-protocol.md:32`	Deployment como actividad posterior a `ready for release` (C-30/C-31).
B-13	🟠	El veredicto no tiene estado destino ni comentario estándar de transición. "Approved con observaciones" no existe en el SDLC.	`sprint-testing/report.md:155-197`; `deployment-runbook.md:303-309`	Mapear veredicto → estado (`ready to merge` / `uat` / `to do`) con C-13/C-14.
B-14	🟠	El umbral "Edge ≥ 80 %" contradice la regla del SDLC ("100 % de REQ críticos y 0 bloqueantes").	`sprint-testing/plan.md:91`; templates `qa-report`	Criterio único de la fuente canónica (§10).

3.2 Referencias rotas

ID	Sev.	Referencia	Ubicación	Corrección
B-15	🔴	Skill `ionflow-playwright-creator` inexistente (la vigente es `e2e-playwright-creator`).	`SKILL.md:336,376,484`; `README.md:13`; `automation/code.md:3,30,107,111,182`; `deployment-runbook.md:415,474`	Actualizar el nombre y la ruta.
B-16	🟠	Rutas de bot-test: `../bot-test/tests/IONFLOW/`, `pages/` y `tickets/<ID>/` no existen (la estructura real es `apps/bot-test/tests/IONFLOW/{Admin-ION,Company-ION,shared,utils}`).	`SKILL.md:100,364-378`; `automation/plan.md:68-69,98`; `automation/code.md:72,121`; `regression/run.md:48-56`	Alinear con la estructura real.
B-17	🟠	Comando NX `--args="--spec=…"` probablemente no llena `{args.spec}`.	`SKILL.md:339`; `regression/run.md:33-35`; `automation/code.md:164`	Verificar y corregir el comando.
B-18	🟠	`../flow_binaries/migrations/*.sql` no existe.	`SKILL.md:403,564`; `deployment-runbook.md:240,494`; `document.md:211`; `test.md:340`; `update-module.md:59`	Apuntar a las fuentes reales de esquema.
B-19	🟠	Skill `release/update-modules` mal nombrada (es `knowledge/update-module`, modo batch).	`SKILL.md:313`; `release/plan.md:194`	Corregir el nombre.
B-20	🟠	CSVs inexistentes (`Test Plan - IONFLOW - Smoke Test.csv`, `Ionflow Version Release - Sheet1.csv`, `get_tickets_deployment_4.csv`).	`release/regression-matrix.md:6,34`; `plan-v1.md:29`; `skills/README.md:298`	Usar las plantillas de `resources/` o leer ClickUp vía MCP.

ID	Sev.	Referencia	Ubicación	Corrección
B-21	🟢	Carpeta `knowledge/L1-project/regression-results/` inexistente, cuando L1 debería ser estable.	`regression/run.md:88` ; `regression/decide.md:98`	Resultados en `knowledge/releases/<producto>/<versión>/` .
B-22	🟢	README enlaza a `idea.md` y `plan.md` (borrados del árbol de trabajo).	`README.md:74-75,117-118`	Recuperarlos en `docs/history/` y actualizar los enlaces (R0).
B-23	🟢	El README de L3 enlaza a `knowledge/sdlc/…` (no existe).	`knowledge/L3-tickets/README.md:36-37`	Enlazar a `sdlc-consolidation.md` y a `docs/sdlc-iond/` .
B-24	🟠	`report` actualiza el template compartido `templates/ticket-memory.md` en lugar de la copia L3.	`sprint-testing/report.md:149`	Escribir solo en `L3/<id>/ticket-memory.md` .
B-25	🟢	Numeración de pasos inconsistente ("Paso 9", "Paso 5/6/7 del Altacrest").	`sprint-testing/plan.md:7` ; `test-docs/document.md:7-9,299` ; `prioritize.md:7,88`	Referenciar estados del SDLC en lugar de pasos.

3.3 Vocabulario y datos de ClickUp

ID	Sev.	Punto de quiebre	Ubicación	Corrección
B-26	🟠	Cuatro taxonomías de tags incompatibles (`core` / `ux-ui` , esquema de `release/plan` , `iond-disc-N` , `qa-regression-v*`).	`SKILL.md:324` ; `release/ingest.md:98,163-165` ; `release/plan.md:108-113` ; `sprint-planning/SKILL.md:58,67` ; `knowledge/L3-tickets/README.md:38`	Taxonomía única (§12 de la fuente canónica).
B-27	🟠	Lectura de veredictos acoplada al texto inicial de approval/rejection ("El resultado de pruebas para este ticket es: APROBADO ✅").	`release/ingest.md:107-108,190-198` ; `release/notes.md:69` ; `knowledge/update-module.md:145`	Las plantillas C-13/C-14 **conservan esa frase**; documentar el contrato de parsing en un solo lugar.
B-28	🟠	Mapeo a módulos L2 inexistentes (`exec-history` , `gateway` , `settings` , `general`) y nombres de módulo distintos entre L1 y L2.	`release/ingest.md:152-157` ; `L1-project/test-priorities.md`	Mapa único Iond Subcategory → módulo L2.
B-29	🟢	Ninguna skill lee la fuente canónica SDLC.	`SKILL.md` ; `knowledge/L1-project/README.md:7-12`	Agregarla a la Regla #1 (carga de contexto) y al README de L1.
B-30	🟢	Solo se usa un subconjunto de los custom fields de IOND, y algunos con valores desactualizados (Project).	`release/ingest.md:96-106` ; `sprint-planning/SKILL.md:54-73`	Usar los custom fields de IOND (13 + Stagemind.Version; G.Version para Gateway — §11 de la fuente canónica).

3.4 Duplicaciones que divergen

ID	Sev.	Regla duplicada	Ubicaciones	Corrección
B-31	🟠	Criterio de **Go/No-Go** definido 3 veces con umbrales distintos.	`regression/decide.md:31-37` ; `release/brief.md:109-112` ; `release/deployment-protocol.md:91`	Una sola regla: C-29 + §10 de la fuente canónica.
B-32	🟠	Esquema de **inyección de TC-CR** definido 2 veces (columnas y prioridades distintas).	`deployment-runbook.md:145-157` ; `code-review/review.md:546-590`	Un solo esquema de Matriz de Pruebas con REQ-ID.
B-33	🟠	**Sugerencia de veredicto** calculada en 3 lugares.	`sprint-testing/test.md:428-446` ; `deployment-runbook.md:265-279` ; `report.md:70-98`	Centralizarla en `mock-testing/report` .
B-34	🟢	La lectura de ClickUp + reconciliación de AC se repite 4 veces, sin un archivo de salida definido.	`discovery-runbook.md:66-110` ; `prioritize.md:34-47` ; `document.md:22-72` ; `deployment-runbook.md:52-58`	Un paso único que produce el insumo de la matriz.
B-35	🟢	Las reglas de evidencia en BD, del canal Playwright y de actualización de repos están copiadas en 4–6 archivos.	`SKILL.md:382-405,436-500,543` ; runbooks; `test.md`	Moverlas a referencias compartidas (`skills/_shared/`).

3.5 Templates

ID	Sev.	Punto de quiebre	Corrección
B-36	🔴	Ningún template está listo para el SDLC. Faltan, entre otros: `requirements-matrix` , solicitud y VoBo, cambio de alcance, comentarios por transición, escalamiento, fuera de matriz, acta de Pilot, acta de Prototype Review, `blocked` , `invalid` , sanity matrix, acta de Go/No-Go, UAT, `merged` , tarea de Release, triage.	Generarlos desde las plantillas T-xx y C-xx de la fuente canónica (R2).
B-37	🟠	Ambiente fijo `dev-app.ionflow.io` / `DEVELOPMENT` en approval, rejection, qa-report, bug-ticket, release-brief y deployment-protocol.	Variables de ambiente y rama por estado.
B-38	🟠	Íconos de severidad distintos entre templates y dos sintaxis de placeholder (`[X]` y `{{x}}`).	Escala única (prioridad nativa) y una sola sintaxis.
B-39	🟠	`test-matrix` usa columna AC en lugar de **REQ-ID**; `rejection` no cita REQ-ID ni estado destino; `ticket-memory` registra "Track".	Agregar REQ-ID, versión de la matriz y VoBo; estado destino `to do` ; tablero y estado actual.
B-40	🟢	`comment.md` y `release-smoke-matrix.md` no se usan; `release-plan.md` lo usa solo `plan-v1` .	Deprecar o reutilizar en R2.

3.6 Base de conocimiento

ID	Sev.	Punto de quiebre	Ubicación	Corrección
B-41	🟠	L1 conserva conceptos anteriores: branching "Dual-Track" y "smoke en cada ticket".	`L1-project/stack-overview.md:56-59` ; `L1-project/test-priorities.md:30`	Actualizar al modelo RC semanal; el smoke es del Release.

ID	Sev.	Punto de quiebre	Ubicación	Corrección
B-42	🟠	El README de L2 lista carpetas inexistentes; `_template.md` no tiene sección de **Reglas de negocio**; las skills dependen de secciones que solo algunos módulos tienen ("Database", "Edge Cases Conocidos", "Selectores E2E").	`L2-modules/README.md:16-22` ; `L2-modules/_template.md`	Template L2 con secciones obligatorias, incluida "Reglas de negocio (fuente de REQ)".
B-43	🟠	El README de L3 describe un archivo único por ticket; en la práctica cada ticket es una carpeta. Hay IDs mixtos (interno y custom), artefactos sin skill productora (reconciliación, approval, rejection) y nombres de iteración no estandarizados.	`L3-tickets/README.md:8,14` ; carpetas L3	Convención: carpeta = ID interno; nombres fijos por estado; iteraciones `-iterN` .
B-44	🟠	El catalyst **no verifica que el veredicto coincida con la matriz de pruebas** actualizada (conteos y estados).	`sprint-testing/report.md`	Validación automática matriz ↔ veredicto antes de proponer C-13/C-14.

3.7 Higiene del repositorio

ID	Sev.	Punto	Corrección
B-45	🟠	`.playwright-mcp/` versionado (logs, snapshots y capturas de staging) y fuera de `.gitignore` .	Ignorarlo y sacarlo del índice.
B-46	🟠	Binarios pesados versionados en L3 (p. ej. un PDF de prueba de ~11 MB).	Mover a almacenamiento externo o a Git LFS.
B-47	🟠	Archivo de entorno de Postman en L3 pendiente de revisar (posibles tokens).	Revisarlo antes de commitear; ignorar `*.postman_environment.json` .
B-48	🟠	`.env.sample` no incluye las 6 variables que usan las skills (`IONFLOW_ENVIRONMENT_URL` , `IONFLOW_KC_DOMAIN` , `IONFLOW_COMPANY_*` , `IONFLOW_ADMIN_*`).	Completarlo sin valores.
B-49	🔴	**Mucho trabajo reciente sin commitear** (carpetas L3, drafts, releases, `resources/` , docs).	Commit organizado en R0, excluyendo secretos y binarios.
B-50	🟢	`idea.md` y `plan.md` (borrados) contienen la visión y el diseño original: orquestación, *gates* humanos y "completar AC ambiguos con el PO".	Recuperarlos en `docs/history/` antes de confirmar el borrado.


3.8 Multi-producto

ID	Sev.	Punto	Corrección
B-51	🟢	L1 y L2 solo cubren iond. IonMind y StageMind no tienen base de conocimiento ni matrices de release propias.	Fase R5 / F5 (implementación futura).

---

4. Arquitectura objetivo: skills por tablero y estado

Principio: el catalyst lee el **tablero y el estado** del ticket en ClickUp (MCP de solo lectura), carga el nivel de conocimiento correcto y ofrece **la skill de ese estado**. ClickUp sigue siendo la fuente oficial. El catalyst **prepara** artefactos y comentarios, y el QA los publica.

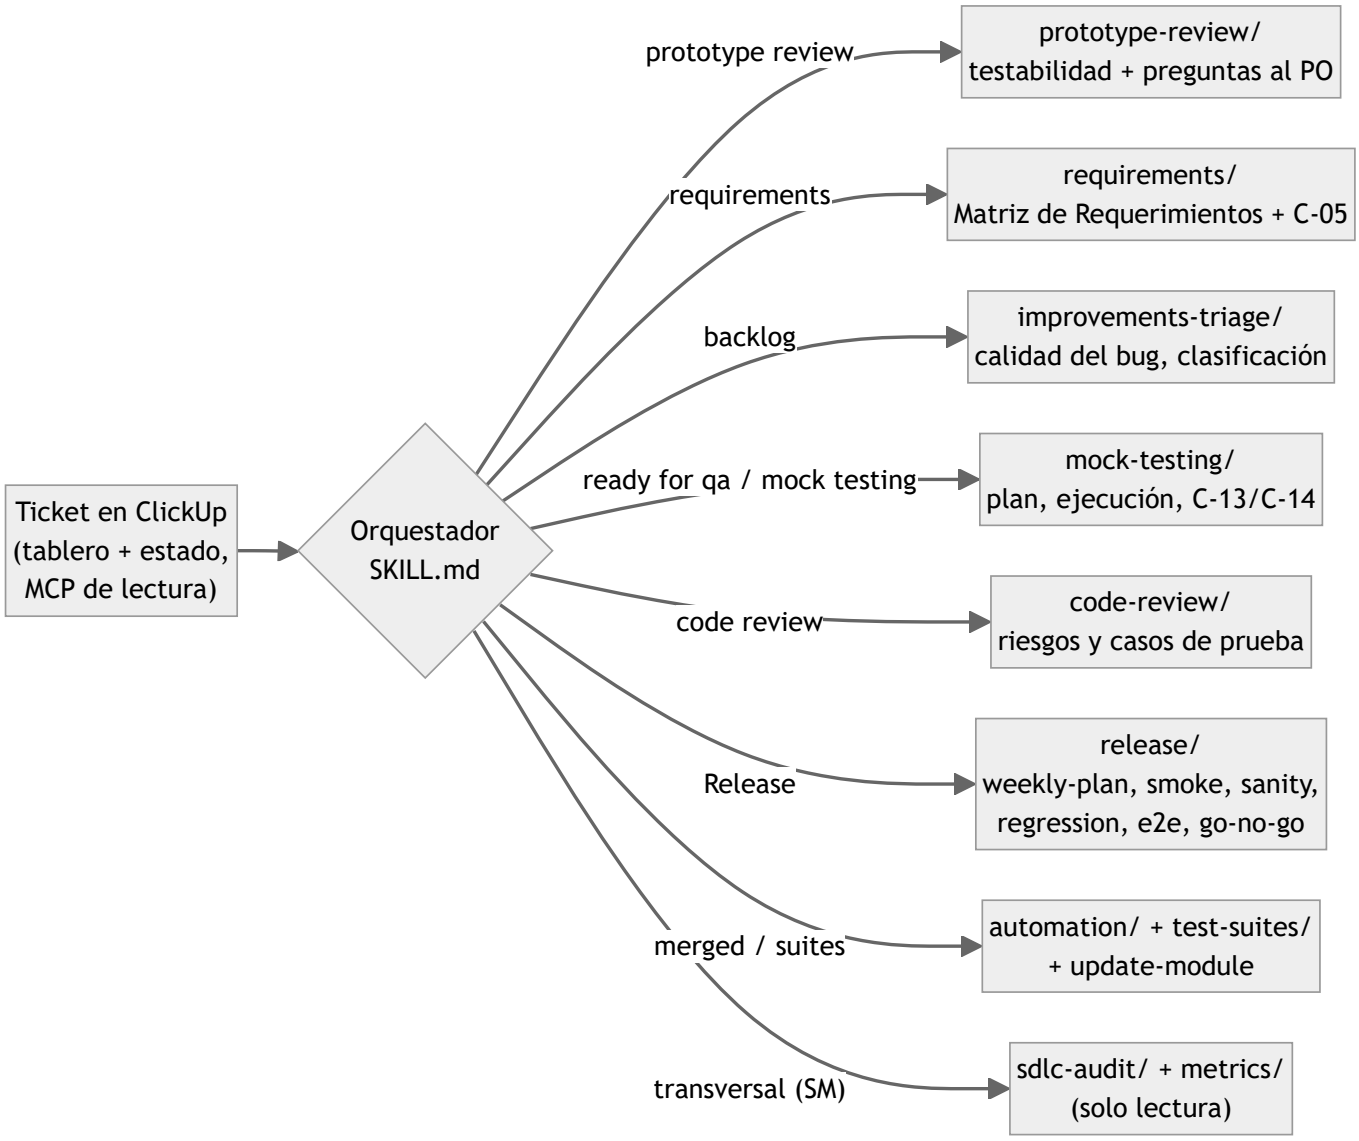

Skill objetivo	Estado(s)	Entradas	Salidas (L3 / releases)	Reutiliza
`prototype-review/`	`prototype review`	Ticket, acta, contrato, L1, L2	`prototype-review-qa.md` (riesgos, testabilidad, preguntas)	`test-docs/prioritize`, `code-review` (modo Discovery), `architecture-brief-qa`
`requirements/`	`requirements`	Especificación del PO, acta, contrato, reglas L2	`requirements-matrix.md` (vN) + borradores C-05/C-08	`test-docs/document` (modo AC)
`improvements-triage/`	`backlog`	Ticket, L2	Checklist T-02, recomendación de clasificación, C-33	`bug-reporter/create`
`mock-testing/`	`ready for qa`, `mock testing`	Matriz con VoBo, handoff C-09, L2	`test-matrix.*` (REQ-ID), `qa-report.md`, C-13/C-14/C-17	`sprint-testing/*`, `deployment-runbook`

Skill objetivo	Estado(s)	Entradas	Salidas (L3 / releases)	Reutiliza
`release/`	Tarea de Release	Tickets por versión objetivo (MCP), matrices L3, E2E maestro	`release-task` (T-04), `tickets`, `smoke-preprod/prod`, `sanity-matrix`, `regression-matrix` (capa 1), `e2e-run` (capa 2), acta C-29, release notes, protocolo de despliegue	`release/*`, `regression/*`
`test-suites/`	Transversal (LQA)	Hoja "Iond Testing Plan", bot-test (lectura), QA Kanban	`e2e-master.csv` con IDs, `coverage.md`, `automation-roadmap.md`, revisión del smoke maestro	— (nueva)
`automation/`	Después de `merged`	Matriz de Pruebas, E2E maestro, L2	Plan, **paquete** para el responsable de bot-test y revisión 3/3 (el catalyst no escribe en bot-test, `Q-54`)	`automation/*`
`sdlc-audit/`	Transversal	Tableros SDLC (MCP)	Reporte de cumplimiento (campos, tags, VoBo, SLAs, anexo de ajustes)	— (nueva)
`metrics/`	Transversal	Tableros SDLC (MCP)	Reporte semanal de métricas (doc 07)	— (nueva)

Formato (`Q-54`): las skills viven en `skills/` en formato agnóstico, con el `SKILL.md` raíz como orquestador y los contratos compartidos en `skills/_shared/` (ClickUp, bot-test, evidencia y artefactos). Para Claude Code se agregan accesos livianos en `.claude/skills/iond-*/SKILL.md` que remiten a esos archivos.

4.1 Suites del release y automatización

Pieza	Ubicación	Función
Smoke maestro	`knowledge/test-suites/smoke-master.md`	Lista fija SMK-01…SMK-17, igual en preprod y producción (`Q-47`)
E2E maestro	`knowledge/test-suites/e2e-master.csv`	Las 250 filas de la hoja con IDs estables, baseline, rotación G1–G4, estado de automatización y trazabilidad (`Q-51`)
Selección y cobertura	`scripts/e2e_master.py`	`import`, `export-sheet`, `coverage` y `select` (capa 1 por riesgo, capa 2 con rotación) con el comando de bot-test por IDs
Mapa de subcategorías	`knowledge/test-suites/_config/subcategory-map.csv`	Iond Subcategory → L2 → módulos del E2E → sistemas cruzados
Hoja de ruta	`knowledge/test-suites/automation-roadmap.md`	Olas 0–3 y tickets de QA Kanban

---

5. Disposición de templates

Template actual	Acción	Resultado
`test-matrix.md`	**Modificar**	Columna REQ-ID, origen (REQ / regla L2 / code review), indicador Mock vs Sanity, sin AC
`approval.md`	**Modificar**	= C-13 (tabla REQ → resultado, fuera de matriz, estado destino)
`rejection.md`	**Modificar**	= C-14 (OBS con REQ-ID, iteración, Rejection_count, destino `to do`)
`qa-report.md`	**Modificar**	Trazabilidad REQ → TC → resultado; criterio único; sin bloque "Smoke" por ticket

Template actual	Acción	Resultado
`ticket-memory.md`	**Modificar**	Tablero y estado actual, versión de la matriz, VoBo, Rejection_count, historial de iteraciones
`bug-ticket.md`	**Modificar**	= T-02 (Project, Iond Subcategory, `det-*`, REQ violado, ticket padre)
`architecture-brief-qa.md`	**Modificar**	Checklist de `prototype review` (contrato, testabilidad, NFR)
`release-brief.md`	**Modificar**	Smoke → Sanity → Regression; Go/No-Go C-29
`release-plan.md`	**Reescribir** → `release-task.md`	Calendario semanal y tarea de Release T-04
`release-regression-matrix.md`	**Reescribir** → `regression-matrix.md`	Capa 1: selección por riesgo desde el E2E maestro + flujos cross-system; los DIRECTA pasan a sanity
`release-smoke-matrix.md`	**Reescribir** → `smoke-run.md`	Ejecución del smoke maestro en preprod o producción (la lista vive en `knowledge/test-suites/smoke-master.md`)
`release-notes.md`	**Mantener**	Por producto y semana
`deployment-protocol.md`	**Modificar**	Rama RC, prerrequisitos SDLC, C-30/C-31, sin `production deploy`
`bug-hunt-report.md`	**Mantener**	Validación continua (bug bash); hallazgos → `backlog` con `det-exploratorio`
`comment.md`	**Deprecar**	Lo reemplaza el paquete C-01…C-33
(nuevos)	**Crear**	`requirements-matrix`, `mini-matrix`, `sanity-matrix`, `e2e-run`, `go-no-go`, `release-task` (T-04), `comments/C-xx` (generados desde la fuente canónica), `prototype-review-qa`, `pilot-notes`, `triage`

6. Disposición de skills


Skill actual	Acción
`discovery-runbook`	**Dividir** en `prototype-review/` + `requirements/`
`deployment-runbook`	**Reemplazar** por `mock-testing/`
`test-docs/prioritize` · `test-docs/document`	**Absorber** en `prototype-review/` y `requirements/`; el modo Matrix pasa a `mock-testing/`
`sprint-testing/plan · test · report`	**Adaptar** dentro de `mock-testing/` (rama del ticket, REQ-ID, estado destino)
`code-review/review`	**Adaptar** (leer PR/rama del ticket; una sola inyección de casos)
`automation/*`	**Adaptar** rutas de bot-test y nombre de la skill E2E; disparo tras `merged`; `code` prepara un paquete para el responsable de bot-test en lugar de escribir código (`Q-54`)
`regression/*` · `release/regression-matrix`	**Unificar** en `release/regression`
`release/ingest · notes · brief · deployment-protocol · bug-hunt`	**Adaptar** (leer tickets por versión objetivo vía MCP; C-23…C-31)
`release/plan` · `plan-v1` · `sprint-planning`	**Retirar** y reemplazar por `release/weekly-plan`
`bug-reporter/create`	**Adaptar** a T-02 y a `improvements-triage/`

Skill actual	Acción
`knowledge/update-module`	**Mantener** (disparo por release desplegado, no por aprobación de QA)
(nuevas)	`sdlc-audit/` , `metrics/` , `release/weekly-plan` , `release/smoke` , `release/sanity` , `release/regression` , `release/e2e` , `release/go-no-go` , `test-suites/`

---

7. Plan de adecuación por etapas (R0–R5)

Etapa	Objetivo	Tareas principales	Esfuerzo	Depende de	Criterio de salida
R0 Higiene	Repo limpio y seguro	Commit del trabajo pendiente; recuperar `idea.md` / `plan.md` en `docs/history/` ; ignorar `.playwright-mcp/` , binarios y entornos de Postman; completar `.env.sample` ; corregir enlaces del README (B-22, B-45…B-50)	S	—	`git status` limpio; sin secretos ni binarios pesados
R1 Vocabulario canónico	Una sola fuente de verdad	Usar `sdlc-consolidation.md` v2.1 (aprobada en F1); referenciarlo en `SKILL.md` (Regla #1) y en el README de L1; actualizar stack-overview, test-priorities y READMEs de L2/L3; mapa lond Subcategory → módulo L2 (B-26…B-30, B-41…B-43)	S	F1	Las skills citan la fuente canónica; sin vocabulario anterior en L1
R2 Templates	Artefactos del SDLC	Crear o modificar según §5; las plantillas C-xx como archivos en `templates/comments/` (B-36…B-40)	M	R1	Templates nuevos revisados por QA y el SM
R3 Skills por estado	Operar por tablero y estado	`requirements/` , `prototype-review/` , `mock-testing/` , `improvements-triage/` , `release/` semanal; *gates* nuevos; retirar `sprint-planning` , `release/plan*` ; corregir referencias rotas (B-01…B-25, B-31…B-35, B-44)	L	R2	Un ticket de Discovery, uno de Improvements y un release recorridos de punta a punta con el catalyst
R4 Gobierno y métricas	Apoyo al SM y a los líderes	`sdlc-audit/` (cumplimiento diario y semanal, ajustes) y `metrics/` (reporte semanal según el doc 07), ambas de solo lectura	M	R3	Reportes generados en 2 semanas consecutivas
R5 Multi-producto	IonMind y StageMind	Perfiles de producto en L1, módulos L2 de IonMind/StageMind, matrices de release por producto, releases en `knowledge/releases/<producto>/<versión>/` (B-51)	L	R3 + acceso a repos y conocimiento	Primer release de IonMind o StageMind acompañado por el catalyst

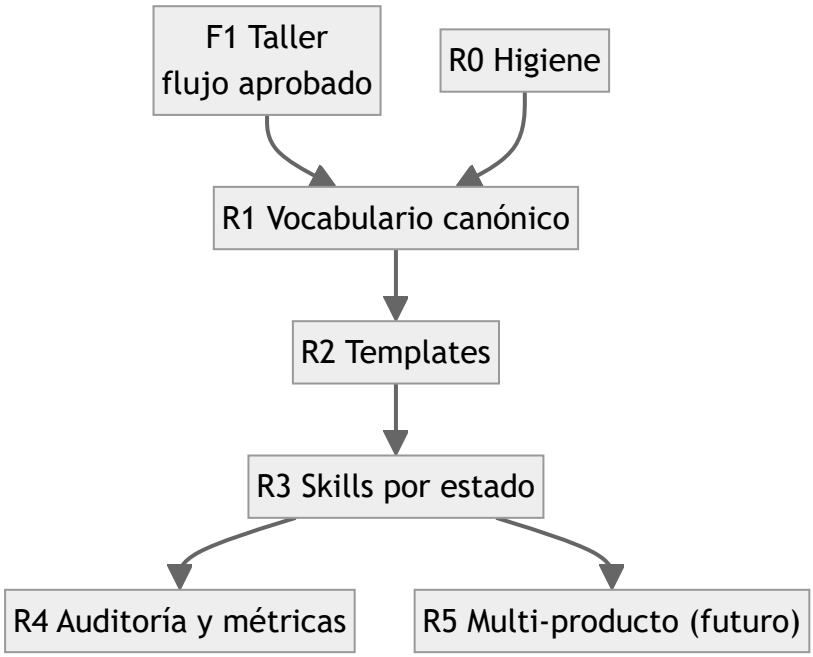

7.1 Estado de la implementación (2026-10-10)

Etapa	Estado	Qué quedó hecho	Pendiente
R0 Higiene	✅	`.gitignore` (logs de Playwright MCP, perfiles de ambiente, entornos de Postman locales), `.env.sample` completo, `docs/history/` con idea, plan, skills y templates retirados, README	Commit del trabajo y salida de `.playwright-mcp/` del índice de git (decisión del QA)
R1 Vocabulario	✅	Fuente canónica v2.2 como Regla #1; READMEs de L1, L2 y L3; `test-priorities` alineado; mapa de subcategorías; template L2 con reglas de negocio, specs y filas E2E	Completar las secciones nuevas en cada módulo L2 (`knowledge/update-module`)
R2 Templates	✅	Templates del SDLC y del release; comentarios C-01…C-33 generados desde la fuente canónica	—
R3 Skills	✅	Skills por estado, de release (herramientas del SM), suites y automatización; orquestador por tablero y estado; accesos `.claude/skills`	Recorrido de punta a punta (criterio de salida)
R4 Gobierno	✅	`sdlc-audit/` y `metrics/`	Dos semanas de reportes (criterio de salida)
R5 Multi-producto	⏳	Estructura `knowledge/releases/<producto>/` y smoke con IonMind y StageMind	Conocimiento L1/L2 de IonMind y StageMind

---

8. Implementación futura: IonMind y StageMind

La metodología (tableros, matriz, release) **ya aplica** a los tres productos. Lo que queda para el futuro es el **soporte del catalyst**, que hoy no tiene información de los repositorios ni base de conocimiento de IonMind y StageMind.

Necesidad	Qué hará falta	Prerrequisito
Contexto de producto	`knowledge/L1-project/products/{ionmind,stagemind}.md` (propósito, arquitectura, APIs, dependencias con iond)	Acceso a los repos `ai_ionmind` / `ai_productmind` y a su documentación
Módulos	`knowledge/L2-modules/<producto>/<módulo>/module.md`	Inventario de módulos y endpoints
Requerimientos de IA	Plantilla de matriz con umbrales, datasets de referencia y criterios estadísticos	Definición de umbrales por el PO (Q-24)
Release por producto	Smoke, sanity y regression propios; orden de despliegue por dependencias	Ramas RC y ambientes preprod de cada producto
Versionado	Ionmind.Version y Stagemind.Version (campos)	Q-42

---

9. Riesgos del refactor

Riesgo	Mitigación
Refactorizar antes de aprobar el flujo genera retrabajo	R1–R3 empiezan **después** de F1 (decidido)
El equipo sigue usando skills del modelo anterior durante la transición	Banner "en adecuación" en `SKILL.md` en R0; uso manual de las plantillas C-xx mientras tanto
Pérdida de conocimiento útil al retirar skills	"Absorber" antes de "retirar": las reglas valiosas (evidencia en BD, heurísticas de code review, bug hunt) pasan a `skills/_shared/`
Lectura de ClickUp frágil (formato de comentarios)	Contrato de parsing documentado en la fuente canónica (frases fijas de C-13/C-14)
