
Acuerdo de Flujo de Trabajo IOND

PO · DEVELOPMENT · QA

Guía para la definición, desarrollo, validación y liberación de tickets

Propuesta por: Steve Nina — Scrum Master IOND
Aplica a: IOND · IonMind · StageMind

PROPÓSITO: Establecer un flujo común, ágil y trazable para el equipo IOND: definir, desarrollar, validar y liberar tickets reduciendo el retrabajo entre QA y Development y entregando versiones semanales confiables.

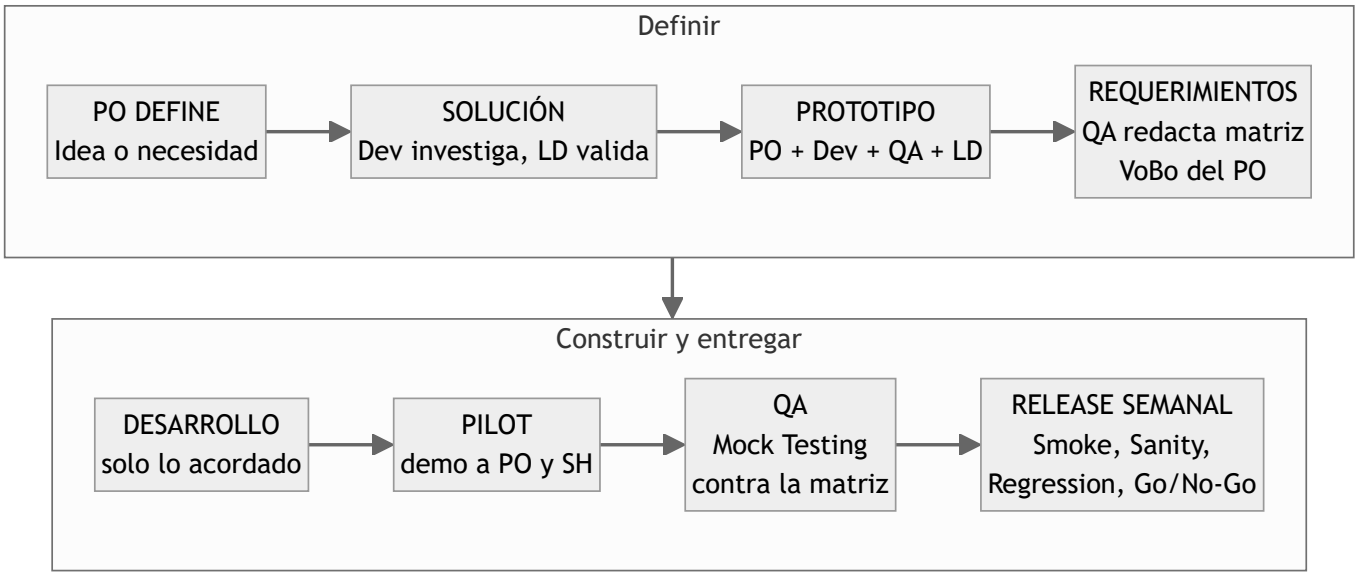

1. Propósito, alcance y objetivo

¿Para qué sirve este documento? Es la guía oficial de trabajo del equipo IOND. Define las reglas para pedir, programar, probar y liberar un ticket en ClickUp en los tableros **Discovery**, **Improvements** y **Releases**.

¿Cuál es su fin práctico? Que los requerimientos no queden en conversaciones verbales o mensajes sueltos. Todo lo que el sistema debe hacer queda escrito en el ticket de ClickUp. Así Development sabe con exactitud qué construir, QA sabe exactamente qué validar y los tickets no rebotan una y otra vez entre ambos.

Objetivo: dejar los requerimientos claros y por escrito **antes** de programar, para que todos entiendan lo mismo y cada semana salga a producción una versión validada.

Condición de éxito: comunicación directa y compromiso conjunto entre PO, Development y QA, con el Scrum Master removiendo bloqueos y el PO interviniendo rápido cuando hay dudas.

Alcance: tickets de los tableros Discovery e Improvements y del folder Releases del espacio NEW GATEWAY IOND en ClickUp.

2. Principios del proceso

1. **El PO define la necesidad.** QA documenta los requerimientos con el apoyo técnico de Development. El PO revisa y da su **visto bueno (VoBo) con un comentario** en el ticket. Development desarrolla y QA prueba.
2. **Sin aprobación punto por punto:** el PO no aprueba fila por fila. Valida la matriz de forma integral y formaliza su VoBo con un único comentario en `requirements`.
3. **Ningún ticket de Discovery pasa a desarrollo sin el VoBo del PO** sobre los requerimientos. Una mejora que pasa por `requirements` en Improvements tampoco.
4. **La Matriz de Requerimientos acordada es el criterio oficial de aceptación y rechazo.**
5. **Ante un desacuerdo no se asume ni se continúa con interpretaciones distintas:** se escala al PO el mismo día.
6. **La documentación es proporcional** a la complejidad y el impacto del cambio.
7. **Los tickets cierran en su kanban** (`merged`). El tablero de Releases gestiona versiones, no tickets.

3. Roles y responsabilidades (equipo IOND)

Rol	Responsabilidad en IOND
PO (Product Owner)	En IOND, un mismo PO para IOND, IonMind y StageMind. Define la necesidad de negocio y la prioridad. Clasifica los tickets de Discovery y aprueba la clasificación de bugs. Revisa la Matriz de Requerimientos y deja su **VoBo** en `requirements`. Resuelve dudas y desacuerdos a tiempo. Decide `invalid`, los cambios de alcance y la UAT. Vota en el Go/No-Go. Lidera la retrospectiva del flujo.
Scrum Master	Facilita el flujo y las ceremonias (incluido `pilot presentation`), vela por los acuerdos, elimina impedimentos (`blocked`), **crea la tarea de Release** semanal con verificación del Dev y monitorea el cumplimiento en ClickUp.
Development	Investiga y presenta la solución en R&D y `prototype review`, apoya a QA con la matriz, **desarrolla estrictamente lo acordado** y entrega el handoff a QA.
Lead Development	Hace el `assignment`, da feedback y validación arquitectónica en R&D y `prototype review`, y vela por la calidad del código en `code review`. Asigna un Dev como assignee en `assignment`. En IOND es también el **Release Manager**; su propio código lo revisan **dos miembros del equipo con mayor antigüedad y ambos deben aprobar**.
QA (Analista de Calidad y Requerimientos)	Asignado desde `assignment`, sigue el ticket de punta a punta. Clasifica los bugs (con aprobación del PO). Elabora la **Matriz de Requerimientos** en `requirements` (con los casos fuera de alcance), diseña y ejecuta la **Matriz de Pruebas** en `mock testing` y ejecuta Smoke, Sanity y Regression en el Release.
Lead QA	**Asigna el QA de cada ticket desde `assignment`**, junto con el Dev que asigna el LD, para que el QA siga la investigación y el prototipo y llegue listo a redactar la matriz en `requirements`. El mismo QA prueba el ticket en `mock testing`; en `ready for qa` el Lead QA solo lo confirma o lo reasigna por capacidad. En Improvements asigna al QA cuando el ticket entra a `requirements` o a `ready for qa`. Gestiona la capacidad de QA, certifica la calidad del release y vota en el Go/No-Go.
Release Manager (= Lead Dev)	Conduce el corte semanal (`dev preparation`), mergea a la rama RC (`ready to merge` → `merged`), despliega el build de cada ticket al ambiente de QA con los workflows de DevOps y coordina el despliegue a producción. Vota en el Go/No-Go.
Stakeholders	Aportan feedback y validación de negocio en Request, Prototype Review, Pilot y UAT. Pueden participar de forma asíncrona por video.
DevOps (equipo externo)	Prepara los workflows de despliegue y ejecuta el despliegue a producción en la ventana acordada.

4. Clasificación del ticket: Discovery vs. Improvements

4.1 Discovery


Corresponde a un ticket que nace de un requerimiento de cliente manejado como proyecto, o que cumple **al menos una** de estas condiciones:

- Crea o modifica una **regla de negocio** del producto (billing, planes, consumo, permisos, marketplace…).
- Impacta **más de un módulo, servicio, repositorio o producto** (p. ej. iond + IonMind).
- Requiere **investigación técnica (R&D)** o cambios de arquitectura o de contrato de API.
- Es una funcionalidad nueva, una refactorización o un cambio estructural.

Flujo Discovery en ClickUp. Tiene dos caminos según el ciclo de vida del ticket.

1. Primera vez (camino regular / happy path): `idea/request` → `assignment` (el LD asigna el Dev y el Lead QA asigna el QA) → `r, d & architect review` → `prototype review` → `requirements` (QA redacta la matriz + VoBo del PO en comentario) → `to do` → `dev in progress` → `pilot presentation` → `code review` → `ready for qa` → `mock testing` → [`uat` , solo si el ticket tiene `uat-requerido`] → `ready to merge` → `merged` .

2. Ciclo de rechazo (retrabajo tras un hallazgo en `mock testing`): el ticket vuelve a `to do` para entrar a la cola. Al retomarse pasa a `dev in progress` y, **sin volver a `pilot presentation`** , sigue a `code review` → `ready for qa` → `mock testing` → `ready to merge` .

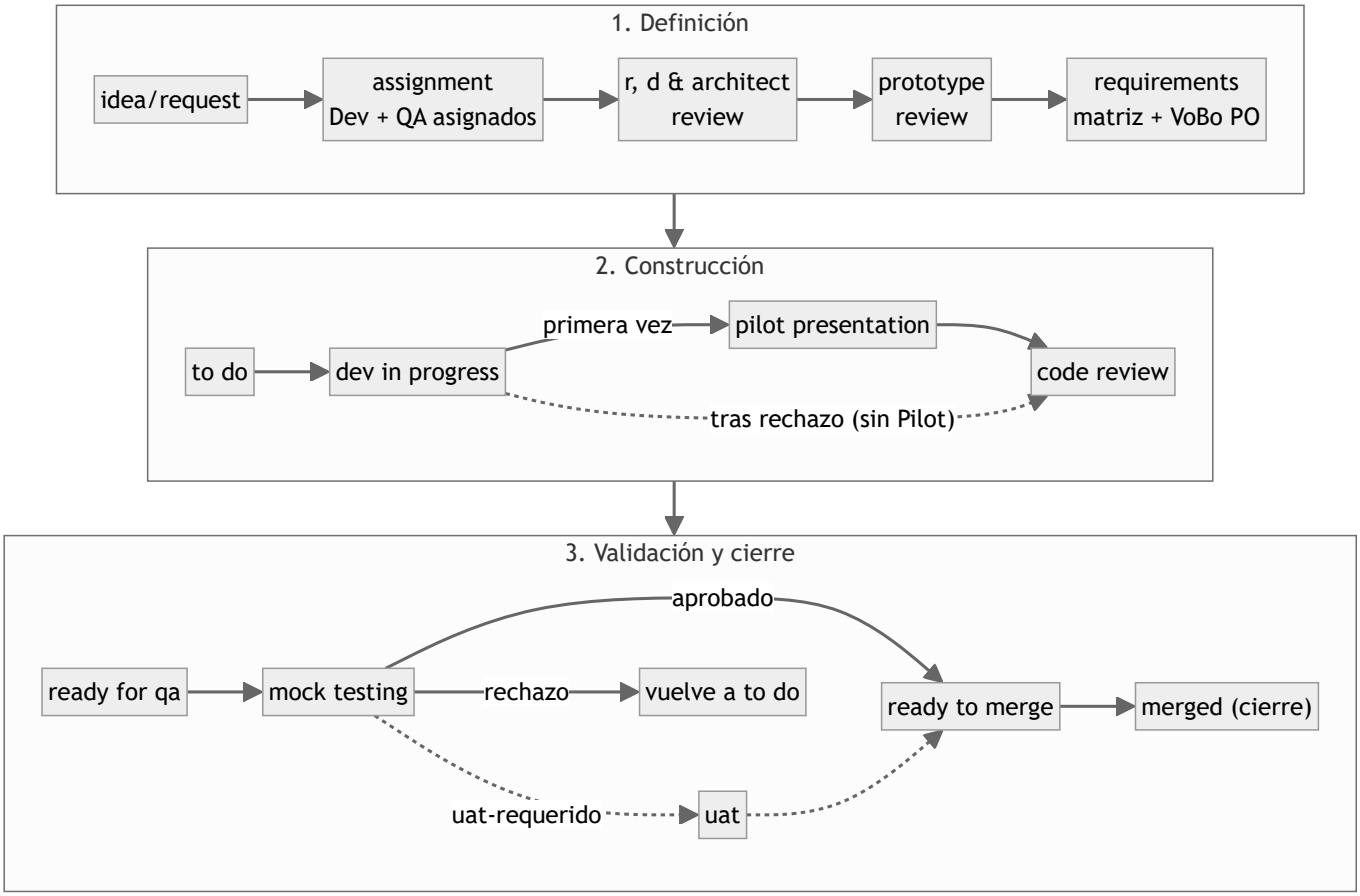

Reglas clave de transición en Discovery:

- **Asignación temprana:** en `assignment` el LD asigna el Dev y el Dev Reviewer, y el Lead QA asigna el QA. Así el QA sigue la investigación y el prototipo, redacta la matriz y luego prueba el mismo ticket.
- **Sin VoBo no se programa:** `requirements` → `to do` solo con el comentario de VoBo del PO y el tag `po-vobo` .
- **Uso de `to do` :** cola para programar tras el VoBo (con el checklist de acuse del Dev marcado) y retorno cuando QA rechaza.
- **Discovery Review:** Request, Prototype Review y Pilot se tratan en una sesión **semanal** en un día dedicado, acordado con el SH. Si el SH no puede asistir, participa por video.
- **Clasificación:** en Discovery clasifica el PO.
- **Bypass de Pilot en correcciones:** ningún ticket corregido tras un rechazo vuelve a `pilot presentation` .
- **Ajustes del Pilot:** si contradicen la matriz, se corrigen en el ticket. Si son nuevos e imprescindibles, son un cambio de alcance (matriz v+1 + VoBo). Si son nuevos y no imprescindibles, van como ticket nuevo a Improvements con el tag `pilot-feedback` .

- **Subtareas:** cierran en `done w/d` (Done With Dependencies) sin QA individual; QA valida el ticket padre. Cuando el padre pasa a `ready to merge`, sus subtareas lo acompañan y lo siguen hasta `merged`. Los spikes de investigación también son subtareas.
- **`blocked`:** estado transversal con causa (`bloq-*`) y plan de acción diario.

4.2 Improvements

Aplica a **bugs, hallazgos de QA, Pilot o UAT, mejoras puntuales y cambios de bajo impacto** sin modificar reglas de negocio troncales.

¿Se mantiene `requirements` en Improvements? Sí, de uso CONDICIONAL / OPCIONAL:

- **Bugs:** van directo `backlog` → `to do` → `dev in progress`. No pasan por `requirements`, porque el reporte ya incluye pasos, resultado esperado y resultado actual.
- **Mejoras puntuales:** pasan por `requirements` cuando hace falta dejar criterios breves de aceptación antes de programar (mini-matriz de hasta 5 REQ + VoBo del PO).
- **Criterio de escalamiento:** si una mejora en `requirements` resulta compleja o toca reglas troncales, el PO la mueve de inmediato a Discovery.
- **Rechazo de QA:** vuelve a `to do`.
- **Clasificación de bugs:** QA clasifica cada bug según su criterio (tablero, TYPE y prioridad = severidad) y el PO lo aprueba en el triage semanal.
- **Sin UAT en Improvements:** en un caso muy excepcional, el PO decide si se valida en el `sanity` del release o si el ticket pasa a Discovery.

`backlog` → [`requirements`] → `to do` → `dev in progress` → `code review` → `ready for qa` → `mock testing` → `ready to merge` → `merged`

5. Matriz de Requerimientos (optimizada para IOND)

La Matriz de Requerimientos es el **registro formal en el ticket de ClickUp** (sección `## Matriz de Requerimientos vN` de la descripción) que especifica el comportamiento esperado.

VoBo del PO: no hay columna de aprobación punto por punto. El PO valida la matriz completa y deja su comentario de VoBo en `requirements`.

ID	Módulo / Servicio	Requerimiento / Regla	¿Cuándo aplica? (condición)	¿Qué debe pasar? (resultado)	Excepciones / Fuera de alcance
REQ-01	Billing / Suscripción	Regla de negocio o validación esperada	Condición de entrada o escenario	Respuesta, estado o comportamiento generado	Casos borde que no aplican o escenarios no incluidos en esta fase

¿Por qué es clave la columna "Fuera de alcance"? Porque fija los límites del ticket. Protege al desarrollador de exigencias no planificadas y deja claro a QA qué comportamientos **no** deben reportarse como error en esta entrega.

Reglas IOND adicionales:

- QA **parte de la especificación del PO** (historia, criterios, fuera de alcance), la normaliza en REQ-IDs y completa condiciones, excepciones y límites. No reescribe lo que ya está claro.
- **Contrato aprobado en `prototype review`:** la matriz lo referencia como parte de la línea base (`REQ-xx: cumplir el contrato vN`).
- **No funcionales** (rendimiento, seguridad, compatibilidad) como filas `REQ-NF-xx` con métrica.
- **Salidas de IA** (IonMind / StageMind): resultado expresado con un **umbral medible** sobre un dataset definido.

- **Épicas con subtareas:** una sola matriz en el ticket padre.
- **Reglas de negocio indefinidas:** QA las detecta y **propone** una opción. El PO **decide** en el VoBo. Nunca quedan a criterio del Dev.
- **Acuse del Dev:** el Dev marca el checklist del ticket "*Matriz de Requerimientos vN leída por el Dev*" antes de programar.

5.1 Matriz de Requerimientos vs. Matriz de Pruebas

Aspecto	Matriz de Requerimientos	Matriz de Pruebas
Pregunta	¿Qué debe hacer el sistema?	¿Cómo comprobamos que funciona?
Momento	Antes del desarrollo (`requirements`)	Durante `mock testing` (y se reutiliza en `sanity`)
Elabora	QA (con apoyo técnico del Dev)	QA
Validación	PO, mediante comentario de VoBo en el ticket	QA (no requiere VoBo del PO)

6. Acuerdos de operación

Regla	Acuerdo
Criterio de rechazo	QA rechaza **únicamente** contra la Matriz de Requerimientos acordada (y el contrato que referencia). Lo que no está contemplado no es rechazo directo: se registra como ticket nuevo (`fuera-de-matriz`).
Desarrollo	Development desarrolla tomando como base los requerimientos con VoBo del PO. Implementar algo distinto es motivo de rechazo.
Cambios durante el desarrollo	Si surge un ajuste: primero se actualiza la matriz (v+1, tag `cambio-alcance`), el PO confirma con un nuevo VoBo y **luego** se modifica el código.
Hallazgos fuera de matriz	Si contradice lo acordado, es un bug de desarrollo. Si es un comportamiento no contemplado, el PO lo evalúa como requerimiento nuevo.
Avance sin bloqueos	Si un ticket tiene varios requerimientos (REQ-01 a REQ-05) y surge una duda en REQ-03, el Dev sigue con los requerimientos ya claros (01, 02, 04, 05) mientras se resuelve la duda.
Ambiente de pruebas	`mock testing` se hace en el ambiente asignado al QA, con la rama del ticket; el LD despliega el build con los workflows de DevOps.
Re-test sin pasos redundantes	Tras un rechazo, QA verifica las correcciones sin exigir repetir etapas ya aprobadas (Pilot, definiciones).
Trazabilidad	Cada transición relevante deja su comentario estándar en el ticket, con la plantilla acordada para esa transición.
Tickets en curso	Los tickets que aún no llegaron a `dev in progress` adoptan este acuerdo completo. Los demás terminan con su documentación vigente, pero siguen las reglas de rechazo, `merged` y Release.

7. Resolución de desacuerdos

REGLA: si QA y Development no llegan a un acuerdo sobre un punto, no se asume ni se continúa con interpretaciones distintas.

1. Registrar en el ticket el punto exacto de discrepancia y la postura de cada parte en 1 o 2 líneas, y agregar el tag `escalado-po` .

2. Notificar al PO **el mismo día** etiquetándolo en el ticket.
3. El PO alinea las posiciones y define la postura del producto en el ticket en un plazo de 4 horas hábiles.
4. Cuando sea necesario, el Scrum Master facilita una sincronización breve de 10 minutos. Si el SM es parte del desacuerdo, facilita el **LD/RM**.
5. Registrar la decisión en los comentarios del ticket para mantener la trazabilidad.

8. Tiempos de respuesta

Actividad	Plazo propuesto
Elaboración de la matriz por QA	1 día para tickets pequeños o medianos · 2 a 3 días para tickets grandes
VoBo del PO en comentario	24 horas hábiles tras la notificación en `requirements`. Sin aprobación tácita: a las 24 h se escala en la daily; a las 48 h el ticket pasa a `blocked` con `bloq-definicion`
Respuesta de QA a dudas de Development	Menos de 2 horas hábiles
Resolución de dudas o desacuerdos bloqueantes	4 horas hábiles
`assignment`: Dev (LD) y QA (Lead QA) asignados	1 día hábil
Code Review	1 día hábil
Confirmación del QA en `ready for qa` (en Improvements, asignación)	1 día hábil
UAT	≤ 3 días hábiles desde la convocatoria
`blocked`	Actualización diaria · escalamiento a las 48 h · decisión a las 72 h

9. Estados oficiales en ClickUp

Categoría	Discovery	Improvements
No iniciado	`idea/request` · `assignment`	`backlog` · `requirements` *(opcional)* · `to do`
Definición	`r, d & architect review` · `prototype review` · `requirements` *(VoBo del PO)*	—
Construcción	`to do` *(cola y rechazos)* · `dev in progress` · `pilot presentation` *(primera vez)* · `code review`	`dev in progress` · `code review`
Validación	`ready for qa` · `mock testing` · `uat` *(condicional)*	`ready for qa` · `mock testing`
Transversal	`blocked`	`blocked`
Salida	`ready to merge` → **`merged`** (cierre) · `done w/d` *(subtareas)* · `invalid`	`ready to merge` → **`merged`** (cierre) · `done w/d` *(subtareas)* · `invalid`

Releases (tarea de Release por producto y versión): `dev preparation` → `unit test & ci` → `smoke` → `sanity` → `regression` → `ready for release`.

10. Releases semanales

Modelo: cada semana hay un sprint en el folder **Releases**. El **SM crea una tarea de Release por producto y versión** (`Release <producto> - vX.Y.Z`) con la verificación del Dev. La tarea documenta el alcance, los tickets incluidos, las ramas RC, el ambiente, los prerrequisitos, las pruebas y el Go/No-Go. **Los tickets no se mueven:** permanecen en su kanban y cierran en `merged` . Si no hay tickets listos, **no se crea release** esa semana.

Estado	Owner	Qué asegura	Timebox
`dev preparation`	RM	Corte, merge atómico de los tickets en `ready to merge` a la rama RC, preprod actualizado; los tickets pasan a `merged`	≤ 0,5 d (lunes)
`unit test & ci`	LD (pipeline)	100 % de las pruebas unitarias en verde (mantenidas por Development)	Horas (lunes)
`smoke`	QA	**Smoke maestro**: la misma lista de caminos críticos y salud de los servicios en todo release	≤ 0,5 d
`sanity`	QA	Propio de la versión: REQ críticos de cada ticket del release en el ambiente integrado	≤ 1,5 d
`regression`	QA	**Capa 1:** regresión de la versión por riesgo + flujos cross-system. **Capa 2:** E2E maestro con todas las features, automatizado y con rotación manual	≤ 1 d + noche
`ready for release`	LQA certifica	**Go/No-Go**: PO + LQA + RM	≤ 0,5 d (viernes)

Bugs durante el release:

- **Bloqueantes** (`urgent`): se corrigen **en la misma rama RC (fix-forward)**.
- **Resto:** según su prioridad, pasan a **tickets de Improvements** previa discusión con el PO y el LD.
- Si un fix-forward no llega a tiempo, el PO, el LD y el RM deciden entre revertir el ticket de la RC (`diferido`) o NO-GO.

Decisión Go/No-Go:

- 🟢 **GO:** sin hallazgos `urgent` abiertos y smoke, sanity y regresión capa 1 aprobados. Una falla de la capa 2 solo pesa si es `urgent` y la provocó el release.
- 🟡 **CONDITIONAL GO:** solo con hallazgos `high` que tengan workaround, riesgo aceptado por el PO y fix agendado.
- 🔴 **NO-GO:** cualquier `urgent` abierto o una regresión en un flujo crítico.

Después del GO:

- **DevOps** despliega en la ventana acordada.
- QA ejecuta el smoke maestro en producción con la **company de prueba** y limpia los datos que crea; el LD/RM monitorea 48 h con DevOps.
- Los incidentes abren el **carril de hotfix**: ticket `urgent` en Improvements con el tag `hotfix` y release extraordinario.

Validación continua: bug bash quincenal (QA + Dev + SM) y validación permanente en producción (PO + QA). Los hallazgos van a `backlog` con su tag de detección.

11. Multi-producto (IOND · IonMind · StageMind)

- Los tres productos usan los mismos tableros y este mismo acuerdo. El campo **Project** identifica el producto.

- **Versión objetivo:** Iond.Version (iond), Ionmind.Version (IonMind) y Stagemind.Version (StageMind). Los tickets con Project = Gateway siguen este acuerdo y usan G.Version.
- **Una tarea de Release por producto y versión.** Cuando hay dependencias, las tareas se relacionan y el despliegue sigue el orden de las dependencias (p. ej. StageMind → IonMind → iond).
- En los productos de IA, el "¿Qué debe pasar?" de la matriz se expresa con umbrales medibles.

12. Medición y revisión del flujo

- Tasa de rechazos de QA por ticket (Rejection_count) y First Pass Yield.
- Lead time y cycle time del ticket desde `idea/request` / `backlog` hasta `merged`.
- Tiempo en `requirements` (cumplimiento del VoBo en 24 h) y tiempo de resolución de escalamientos al PO.
- Hallazgos por fase (`det-*`), hallazgos fuera de matriz y escapes a producción.
- Resultado de cada Go/No-Go, fix-forward y hotfix por release.
- **Retrospectiva del flujo liderada por el PO:** es el espacio donde el equipo analiza qué funcionó, qué causó fricción o retrabajo entre Dev y QA y qué acuerdos deben ajustarse para que el siguiente ciclo sea más rápido, fluido y sin bloqueos.

13. Compromisos del equipo IOND

- No avanzar sin alineación; escalar las dudas al PO el mismo día.
- Desarrollar y probar con base en los requerimientos acordados.
- Mantener la trazabilidad en los comentarios de ClickUp.
- Respetar el corte semanal y la decisión del Go/No-Go.
- Registrar todo hallazgo fuera de la matriz como ticket nuevo, sin bloquear el ticket en curso.

14. Resumen ejecutivo del flujo

Fase	Responsable principal	Resultado clave
Necesidad	PO	Necesidad de negocio definida y priorizada
Solución	Development + LD	Solución técnica investigada y aprobada
Prototipo	PO + Dev + QA + LD	Prototipo y contrato de interfaz aprobados
Asignación	LD + Lead QA	Dev y QA asignados al ticket
Requerimientos	QA + PO	Matriz documentada con VoBo del PO
Desarrollo	Development	Código implementado sobre lo acordado
Piloto	SM + Dev + PO + SH	Visto bueno preliminar y ajustes clasificados
Validación	QA	Ticket validado en `mock testing` (y UAT si aplica)
Integración	RM	Ticket `merged` en la RC semanal
Release	QA + LQA + PO + RM	Versión aprobada en el Go/No-Go y desplegada
