Guía Operativa ClickUp — Versión Development + QA

Qué hacer en cada estado, qué llenar y qué comentar en los tableros SDLC de IOND

Propuesta por: Steve Nina — Scrum Master IOND

Aplica a: IOND · IonMind · StageMind

Audiencia: Developers (Dev y Lead Dev) y QA (QA y Lead QA) que trabajan en los tableros Discovery, Improvements y Releases del espacio NEW GATEWAY IOND.

Dato	Valor
Espacio ClickUp	NEW GATEWAY IOND
Tableros	Discovery · Improvements · Releases
Fuente canónica	`knowledge/L1-project/sdlc-consolidation.md` (v2.3)
Documento par	`06a` — Guía de Gobierno ClickUp, versión Scrum Master

Contenido

1. Cómo usar esta guía y las 10 reglas de oro
2. Mapa rápido de los 3 tableros
3. Qué hago en cada estado
4. Checklists DoR y DoD
5. Protocolos
6. Plantillas de tarea
7. Plantillas de comentario
8. Tags que puedes usar
9. Qué hacen las automatizaciones por ti
10. Severidad
11. Preguntas frecuentes

1. Cómo usar esta guía y las 10 reglas de oro

Esta guía es tu referencia rápida para el día a día en ClickUp. Busca el estado en el que está tu ticket en la **sección 3** para saber qué te toca, qué campos llenar, qué comentario publicar y a dónde se mueve. Antes de mover un ticket, revisa el **checklist DoR** del estado de destino (sección 4). Si pasa algo fuera de lo normal (un rechazo, un desacuerdo, un bloqueo, un cambio de alcance), sigue el **protocolo** de la sección 5. Los comentarios se copian tal cual de la sección 7. Los nombres de estado aparecen siempre como en ClickUp, en minúsculas (por ejemplo, `ready for qa`), y `(Q-xx)` remite a la decisión del *Registro de Decisiones* (documento 03).


Las 10 reglas de oro

1. **Lo que no está en ClickUp no existe.** Las decisiones de una reunión o de un chat se registran en el ticket con su comentario estándar.
2. **Sin VoBo no se programa.** Un ticket que pasa por `requirements` solo entra a `to do` con el comentario de VoBo del PO (C-06) y el tag `po-vobo`.
3. **QA solo rechaza contra la matriz.** El criterio de rechazo es la Matriz de Requerimientos con VoBo vigente; cada rechazo cita el REQ-ID que no se cumple.
4. **Todo PR va en Merge Request.** Un PR por repositorio en Merge Request, Merge Request 2, 3 y 4, antes de pasar a `code review`.
5. **Un comentario estándar por transición.** Cada cambio de estado relevante lleva su plantilla C-xx, publicada antes del movimiento o en el mismo momento.
6. **`done w/d` es solo para subtareas.** Un ticket padre nunca se cierra en `done w/d`. Cuando el padre pasa a `ready to merge`, sus subtareas lo acompañan y lo siguen hasta `merged` (A-20).
7. **`merged` es el cierre.** El ticket cierra en su propio kanban cuando el RM lo integra a la rama RC; no se mueve al tablero de Releases.
8. **Ante un desacuerdo, `escalado-po`.** No se asume ni se sigue con interpretaciones distintas: se registra (C-15) y el PO decide en el día.
9. **Ante un bloqueo, `blocked` con tag de causa.** El ticket pasa a `blocked` con su tag `bloq-*` y un plan de acción (C-20) que se actualiza cada día.
10. **Un hallazgo fuera de la matriz va a un ticket nuevo.** Se crea un ticket con `fuera-de-matriz` (C-17); no es motivo de rechazo.

2. Mapa rápido de los 3 tableros

2.1 Discovery


Funcionalidades nuevas, refactorizaciones y cambios estructurales o de reglas de negocio, desde la idea hasta el merge.

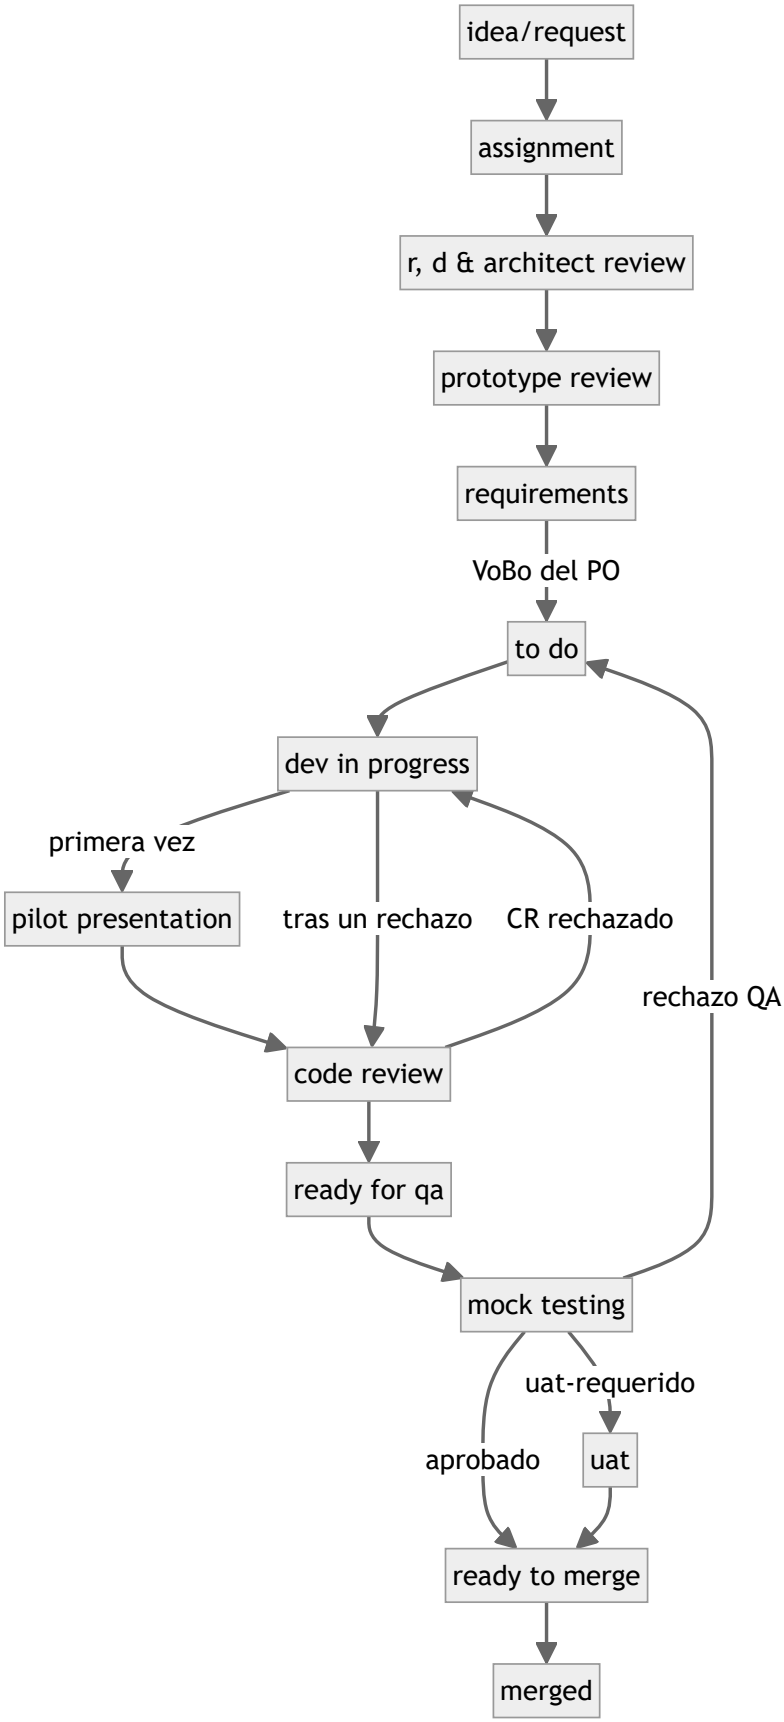

Además: `blocked` se usa desde cualquier estado activo y se vuelve al estado previo; `invalid` es una decisión del PO; `done w/d` cierra subtareas.


2.2 Improvements

Bugs, hallazgos de QA o del Pilot, mejoras puntuales y deuda técnica acotada, sin cambios en reglas de negocio troncales.

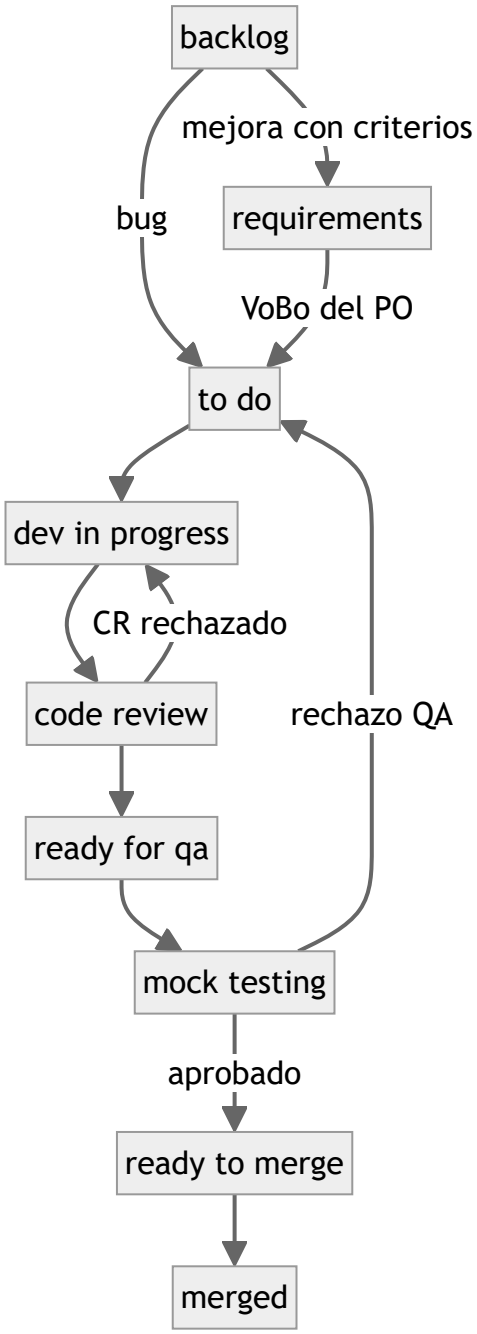

2.3 Releases

Una tarea de Release por producto y versión cada semana. Los tickets **no** se mueven aquí: la tarea de Release los referencia.

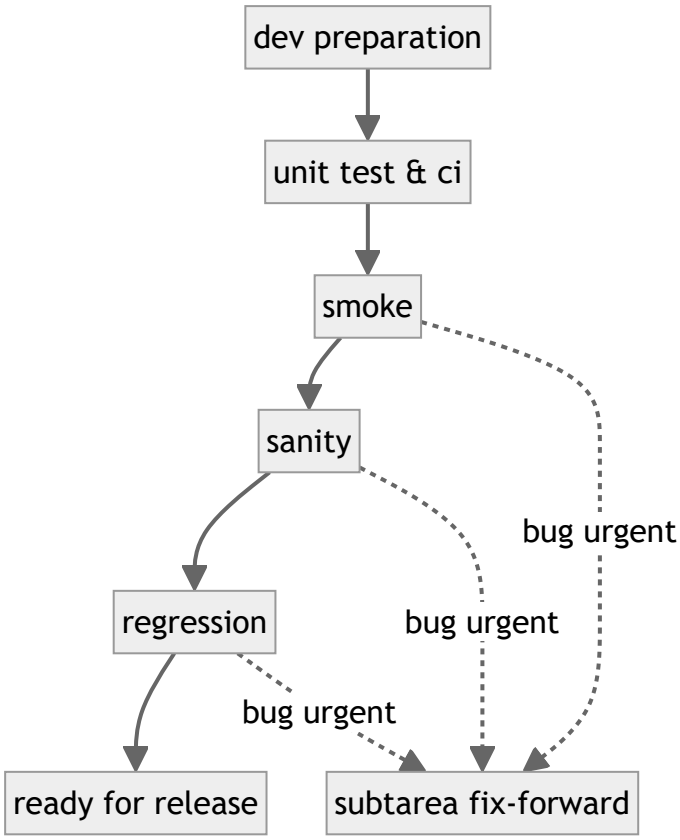
dev preparation
unit test & ci
smoke
sanity
regression
ready for release
subtarea fix-forward
bug urgent
bug urgent
bug urgent

3. Qué hago en cada estado

Cómo leer las tablas: "Campos" indica los custom fields que deben quedar llenos en ese estado (entre paréntesis, quién los llena si no eres tú). "Comentario" indica la plantilla de la sección 7 y quién la publica. "Siguiente" indica a dónde se mueve el ticket y quién lo mueve.

3.1 Discovery

Estado	Si eres Dev	Si eres QA	Campos	Tags	Comentario	Siguiente
`idea/request`	Si te convocan, aporta viabilidad en el refinamiento.	Asiste al refinamiento; pregunta por testabilidad y casos límite.	TYPE · Project · Iond Subcategory (creador)	Área `iond-*`	C-01 (PO)	`assignment` (PO) · `invalid` (PO)
`assignment`	Acepta, confirma que tienes la información básica y mueve a R&D.	El LQA te asigna como Reviewer QA (Q-55): lee el request y anota tus preguntas para el R&D y el prototipo.	Assignee · Dev Reviewer (LD) · Reviewer QA (LQA)	—	C-02 (LD)	`r, d & architect review` (Dev)
`r, d & architect review`	Spike o POC: opciones, recomendación, repos, borrador de API, riesgos y requisitos no funcionales. Las subtareas de investigación cierran en `done w/d`.	Opcional: señala riesgos de testabilidad.	—	—	C-03 (Dev, con aprobación del LD)	`prototype review` (Dev)
`prototype review`	Presenta el prototipo y el contrato de interfaz.	Valida la testabilidad y toma nota de los requerimientos iniciales.	—	—	C-04 (acta)	`requirements` · vuelve a R&D
`requirements`	Apoya técnicamente, lee la matriz y marca el **checklist de acuse** del ticket (Q-23). **No programes todavía.**	Redacta la Matriz vN (fuera de alcance, REQ críticos, datos de prueba), pide el VoBo y, al recibirlo, agrega `po-vobo`. Estima QA Points.	Reviewer QA · QA Points	`po-vobo` · `uat-requerido` (PO)	C-05 (QA) · C-06 (PO) · checklist de acuse (Dev; dudas en C-07)	`to do` (QA, solo con `po-vobo`)
`to do`	Toma el ticket cuando tengas capacidad. Si viene de un rechazo, lee primero el C-14.	Responde dudas en menos de 2 h hábiles.	—	—	—	`dev in progress` (Dev)
`dev in progress`	Código según la matriz, pruebas unitarias, linters limpios, PR registrados y handoff.	Responde dudas y prepara la Matriz de Pruebas.	Merge Request 1–4	—	C-09 (Dev)	`pilot presentation` (primera vez) · `code review` (tras un rechazo)

Estado	Si eres Dev	Si eres QA	Campos	Tags	Comentario	Siguiente
`pilot presentation`	Haz la demo en el ambiente local o dev.	Asiste y contrasta cada ajuste con la matriz.	—	`pilot-feedback` · `cambio-alcance`	C-10 (SM)	`code review` (SM)
`code review`	Atiende las observaciones del revisor; CI en verde.	—	Merge Request · Dev Reviewer	—	C-11 (LD)	`ready for qa` · `dev in progress`
`ready for qa`	Confirma el build desplegado en QA, las migraciones y las variables.	El LQA confirma al Reviewer QA asignado en `assignment` (solo reasigna por capacidad); el QA confirma QA Points y fecha de inicio.	Reviewer QA · QA Points	—	C-12 (LQA)	`mock testing` (QA, al iniciar)
`mock testing`	Da soporte puntual. No hagas merge.	Ejecuta la Matriz de Pruebas; aprueba o rechaza con REQ-ID y evidencia; registra los hallazgos fuera de matriz.	Rejection_count (+1 si rechazas)	`fuera-de-matriz` (ticket nuevo) · `escalado-po`	C-13 · C-14 · C-17 (QA)	`uat` · `ready to merge` · `to do`
`uat`	Corrige si una observación contradice la matriz.	Acompaña la sesión y registra el resultado.	—	`uat-requerido`	C-18	`ready to merge` · `to do`
`ready to merge`	Mantén tus PR sin conflictos y atiende al RM.	—	Versión objetivo según el Project (SM/RM)	—	—	`merged` (RM)
`blocked`	Si detectas el impedimento: mueve, etiqueta, comenta y actualiza cada día.	Igual que Dev.	—	`bloq-*`	C-20 · C-21	Estado previo
`done w/d`	Cierra tus subtareas cuando estén integradas en la rama del padre. Siguen al padre a `ready to merge` y `merged` (A-20).	No pruebes la subtarea: valida el ticket padre.	—	—	—	— (solo subtareas)
`merged`	Nada más: el ticket está cerrado.	Se re-verifica en el `sanity` del Release.	—	—	C-19 (RM)	— (cierre)
`invalid`	—	—	—	—	C-22 (PO)	—

3.2 Improvements

Estado	Si eres Dev	Si eres QA	Campos	Tags	Comentario	Siguiente
`backlog`	Registra el bug o la mejora con T-02 / T-03 o el Form.	Registra los bugs con T-02 o el Form, deja la evidencia y **clasifica** el bug (tablero, TYPE y prioridad = severidad) para la aprobación del PO en el triage (Q-15).	TYPE · Project · Iond Subcategory · prioridad	`det-*` (bugs) · área	C-33 (PO/SM)	`to do` · `requirements` (PO/SM)
`requirements` *(opcional)*	Apoya y marca el checklist de acuse. **No programes todavía.**	Mini-matriz (hasta 5 REQ) + checklist de no regresión; pide el VoBo.	Reviewer QA · QA Points	`po-vobo`	C-05 · C-06 · C-07	`to do` (QA, con `po-vobo`)
`to do`	Toma el ticket. Si viene de un rechazo, lee el C-14.	—	—	—	—	`dev in progress` (Dev)
`dev in progress`	Fix o mejora con una **prueba unitaria que certifique la solución**; PR; handoff corto.	Prepara la verificación y la no regresión de zonas cercanas.	Merge Request 1–4	—	C-09 (versión corta)	`code review` (Dev)
`code review`	Atiende el review; CI en verde.	—	Merge Request · Dev Reviewer	—	C-11 (LD)	`ready for qa` · `dev in progress`
`ready for qa`	Confirma el build en QA.	El LQA asigna (o confirma, si pasó por `requirements`); el QA confirma QA Points.	Reviewer QA · QA Points	—	C-12 (LQA)	`mock testing` (QA)
`mock testing`	Da soporte puntual.	Bug: se cumple el resultado esperado y la no regresión. Mejora: se cumple la mini-matriz.	Rejection_count	`fuera-de-matriz` · `escalado-po`	C-13 · C-14 · C-17	`ready to merge` · `to do`
`ready to merge`	Mantén el PR sin conflictos.	—	Versión objetivo (SM/RM)	—	—	`merged` (RM)
`blocked`	Igual que en Discovery.	Igual que en Discovery.	—	`bloq-*`	C-20 · C-21	Estado previo
`done w/d`	Solo subtareas.	Valida el padre.	—	—	—	—
`merged`	Ticket cerrado.	—	—	—	C-19 (RM)	— (cierre)
`invalid`	—	—	—	—	C-22 (PO)	—

3.3 Releases (tarea de Release)

Estado	Si eres Dev	Si eres QA	Campos	Tags	Comentario	Siguiente
`dev preparation`	Antes del corte, confirma tus PR y prerrequisitos (migraciones, variables, dependencias); ayuda al RM con los conflictos.	Prepara la ejecución del smoke maestro, la matriz de Sanity (REQ críticos de cada ticket), la selección de la regresión (capa 1) y el grupo de rotación del E2E maestro (capa 2), y los datos de prueba.	—	—	C-23 (RM)	`unit test & ci`
`unit test & ci`	Si un test falla, corrígelo de inmediato.	—	—	—	C-24	`smoke`
`smoke`	Mantente disponible para un fix-forward.	Ejecuta el **smoke maestro** (la misma lista en todo release); un bug `urgent` abre fix-forward.	—	`fix-forward` · `det-smoke`	C-25 · C-28	`sanity`
`sanity`	Soporte puntual; fix-forward si aplica.	Re-ejecuta los REQ críticos de cada ticket en preprod.	—	`det-sanity`	C-26	`regression`
`regression`	Soporte puntual.	**Capa 1:** suite de la versión por riesgo y flujos cross-system. **Capa 2:** E2E maestro (automatizado de noche + rotación manual).	—	`det-regression`	C-27	`ready for release`
`ready for release`	Mantente disponible en la ventana de despliegue.	El LQA certifica y vota en el Go/No-Go; QA hace el smoke maestro en producción con la company de prueba tras el despliegue.	—	`det-prod` (si hay incidente)	C-29 · C-30 · C-31	— (cierre)

4. Checklists DoR y DoD

4.1 DoR para pasar a `to do`

Discovery

- [ ] La Matriz de Requerimientos vN está en la descripción, con su columna Fuera de alcance, los REQ críticos marcados y la sección de datos de prueba.
- [ ] El contrato aprobado en `prototype review` (C-04) está referenciado en la matriz.
- [ ] QA publicó la solicitud de VoBo (C-05).
- [ ] El PO publicó su VoBo (C-06) y el ticket tiene el tag `po-vobo`.
- [ ] Se decidió si requiere UAT (`uat-requerido` , lo marca el PO).
- [ ] El Dev marcó el checklist "*Matriz vN leída por el Dev*" (Q-23).
- [ ] Reviewer QA, QA Points y Dev Reviewer están llenos.

Improvements

- [ ] TYPE, Project, Iond Subcategory (si Project = Iond) y prioridad están llenos.
- [ ] Si es un bug: pasos, resultado esperado, resultado actual, ambiente, evidencia y tag `det-*`.
- [ ] El triage está registrado (C-33).
- [ ] Si pasó por `requirements` : mini-matriz con VoBo (C-06 + `po-vobo`).

4.2 DoR para pasar a `code review`

- [ ] El código cubre los REQ de la matriz (o el resultado esperado del bug).
- [ ] Las pruebas unitarias están en verde (meta: cobertura de 80 % o más en código nuevo, si el repositorio lo soporta).
- [ ] Los linters están limpios.
- [ ] Cada PR está registrado en Merge Request, Merge Request 2, 3 o 4 (uno por repositorio, sin URLs repetidas).
- [ ] Se publicó el handoff C-09.
- [ ] El Dev Reviewer está asignado.
- [ ] Discovery, primera vez: el Pilot se realizó y su acta (C-10) está publicada.

4.3 DoR para pasar a `ready for qa`

- [ ] El Code Review está aprobado (C-11) y la CI está en verde.
- [ ] El build de la rama del ticket está desplegado en el ambiente de QA.
- [ ] Las migraciones y variables están aplicadas e informadas en el C-09.
- [ ] El Reviewer QA está asignado (o el LQA fue avisado para asignarlo).

4.4 DoR para pasar a `ready to merge`

- [ ] QA publicó la aprobación (C-13) con evidencia por REQ.
- [ ] El 100 % de los REQ críticos está aprobado y no hay bugs `urgent` abiertos.
- [ ] Si el ticket tiene `uat-requerido`: la UAT está aprobada (C-18).
- [ ] Los hallazgos fuera de matriz están registrados como tickets nuevos (C-17).
- [ ] Los PR no tienen conflictos con la rama destino.
- [ ] La versión objetivo está registrada o se avisó al SM/RM para registrarla.

4.5 DoD del ticket (= `merged`)

- [ ] Los PR están mergeados en la rama RC de la semana.
- [ ] El RM publicó C-19 con la rama RC, la versión y el enlace a la tarea de Release.
- [ ] La versión objetivo está registrada (Iond.Version, Ionmind.Version, Stagemind.Version o G.Version, según el Project).
- [ ] Todas las subtareas están en `done w/d`.
- [ ] El Rejection_count refleja los rechazos de QA documentados.
- [ ] No queda ningún `escalado-po` abierto y el ticket no está en `blocked` (los tags `bloq-*` se conservan como historial).
- [ ] Los tickets derivados (`fuera-de-matriz`, `pilot-feedback`) están enlazados.

DoD de una subtarea (`done w/d`): código terminado, validado localmente e integrado en la rama del ticket padre. QA valida en el padre.

5. Protocolos

5.1 Rechazo (QA)

1. Confirma que el problema **contradice un REQ** de la matriz vigente (o el resultado esperado del bug). Si no, aplica el protocolo de hallazgo fuera de matriz (5.6).
2. Publica C-14 con una observación por REQ incumplido: severidad, REQ-ID, pasos, resultado esperado, resultado actual y evidencia.
3. Suma 1 a **Rejection_count** (es manual; ClickUp te lo recuerda).
4. Mueve el ticket a `to do`, en Discovery y en Improvements.
5. El Dev corrige y el ticket recorre `dev in progress` → `code review` → `ready for qa` → `mock testing`. **No vuelve a `pilot presentation`.**

5.2 Re-test (QA)

1. Lee tu C-14 anterior y verifica cada observación: resuelta o persistente.
2. Re-ejecuta los REQ críticos y las zonas cercanas afectadas por el cambio. **No exijas repetir etapas ya aprobadas** (Pilot, definiciones).
3. Si aparece algo nuevo: si contradice un REQ, es una observación nueva o una regresión del ticket; si no, es un hallazgo fuera de matriz.
4. Publica C-13 (aprobado) o C-14 (nueva iteración, con el número de iteración) y mueve el ticket según el resultado.

5.3 Desacuerdo y escalamiento

1. Registra en el ticket el punto exacto y la postura de cada parte en 1–2 líneas (C-15) y agrega el tag `escalado-po`.
2. ClickUp avisa al PO; avísale también por el canal habitual **el mismo día**.
3. Mientras tanto, sigue con los REQ no afectados. No implementes ni pruebes interpretaciones propias del punto en discusión.
4. El PO decide en un máximo de 4 h hábiles (C-16) y retira `escalado-po`. Si hace falta, el SM facilita una sincronización de 10 minutos; si el SM es parte del desacuerdo, facilita el LD/RM (Q-03).
5. Aplica la decisión: es un bug del ticket (se corrige), se acepta el comportamiento, es un cambio de alcance (5.4) o es un ticket nuevo.

5.4 Cambio de alcance (después del VoBo)

1. Solo el **PO** solicita o aprueba un cambio de alcance.
2. QA actualiza la matriz a la versión v+1, marca las filas cambiadas, publica C-08 y agrega `cambio-alcance` (ClickUp retira `po-vobo` automáticamente).
3. El Dev **no modifica el código** de lo cambiado hasta el nuevo VoBo; puede seguir con los REQ que no cambiaron.
4. El PO da el nuevo VoBo (C-06); QA vuelve a poner `po-vobo`. El tag `cambio-alcance` se conserva como historial (si hay otro cambio, QA retira `po-vobo` a mano).

5. El Dev implementa el cambio y QA actualiza su Matriz de Pruebas.

5.5 Bloqueo

1. Mueve el ticket a `blocked` desde el estado en el que estaba. ClickUp agrega al SM como watcher y fija el vencimiento a 2 días; si el ticket tenía otra fecha de vencimiento, anótala en el C-20.
2. Agrega el tag de causa: `bloq-externo`, `bloq-ambiente`, `bloq-definicion` o `bloq-dependencia`. Si depende de otro ticket, usa la dependencia nativa (*waiting on*).
3. Publica C-20 con el impedimento, de quién depende y el plan de acción. Actualízalo cada día (se revisa en la daily).
4. A las 48 h ClickUp escala al SM y al LD (y al PO si es `bloq-definicion`). A las 72 h se decide: reprogramar, dividir el ticket o reclasificarlo (lo decide el PO) (Q-31).
5. Al resolverse: vuelve al estado previo, publica C-21 y restituye la fecha de vencimiento anterior. El tag `bloq-*` **se conserva** como historial de la causa.

5.6 Hallazgo fuera de la matriz

1. Confirma que lo observado no está en ningún REQ o que figura en la columna Fuera de alcance.
2. Crea un ticket nuevo en Improvements (`backlog`) con T-02 o T-03, con los tags `fuera-de-matriz` y `det-*`, y enlázalo al ticket de origen.
3. Publica C-17 en el ticket de origen con el enlace al ticket nuevo.
4. El hallazgo **no bloquea** el ticket de origen: su veredicto se basa solo en la matriz.
5. El PO decide la prioridad del ticket nuevo en el triage.

5.7 Fix-forward en el Release (Q-34)

Cuándo aplica: a un bug con prioridad `urgent` (bloqueante) detectado en `smoke`, `sanity` o `regression` de la tarea de Release. Los bugs `high`, `normal` y `low` **no** son fix-forward: van a Improvements (paso 8). Un `high` solo entra como fix-forward si el PO y el LD lo deciden de forma explícita.

Quién decide: el PO y el LD/RM. **Plazos:** decisión en **≤ 4 h hábiles** desde el aviso; corrección lista y re-verificada en **≤ 1 día hábil**.

Paso	Quién	Qué hace	Dónde queda
1	QA	Reproduce el bug `urgent` y avisa de inmediato al PO y al LD/RM.	Comentario con evidencia en la tarea de Release
2	QA	Crea una **subtarea** de la tarea de Release: TYPE `Bug`, prioridad `urgent`, tags `fix-forward` + `det-smoke` / `det-sanity` / `det-regression`, relación con el ticket de origen. La subtarea se crea en el estado de la fase donde se detectó.	Subtarea + C-28 ("Detectado en")
3	PO + LD/RM	Deciden en ≤ 4 h: **fix-forward**, **revertir el ticket de origen** (`diferido`) o **NO-GO**.	C-28 ("Decisión")
4	Dev	Corrige **en la rama RC** (no en la rama del ticket) y registra el PR en la subtarea (Merge Request).	Merge Request + C-28
5	LD (o los dos revisores senior si el PR es del LD/RM)	Revisan y aprueban el PR.	PR aprobado

Paso	Quién	Qué hace	Dónde queda
6	LD/RM	Despliega la RC corregida en preprod con los workflows de DevOps.	Comentario en la tarea de Release
7	QA	Re-ejecuta la verificación afectada (y el smoke del área si aplica), actualiza C-28 y cierra la subtarea en `ready for release`.	C-28 ("Re-verificación QA: ✅")
8	PO + LD	Los bugs **no bloqueantes** se registran como tickets nuevos en Improvements (`backlog` , T-02, tag `det-*`) y se priorizan en el triage; no detienen el release.	Tickets nuevos en Improvements

Si el fix no está listo en 1 día hábil: el PO, el LD y el RM deciden entre:

- **Revertir el ticket de origen de la RC:** el ticket sale de `merged` , vuelve a `to do` en su kanban con el tag `diferido` (no suma Rejection_count), se actualiza su versión objetivo y reingresa a un corte posterior después de pasar de nuevo por `mock testing` .
- **Declarar NO-GO** (C-29): la tarea de Release se queda en `regression` , se reprograma su fecha de vencimiento al siguiente Go/No-Go y se registra el motivo.

Reglas: a la RC solo entran fix-forward aprobados. Todo fix-forward se re-verifica antes del Go/No-Go. Un `urgent` abierto siempre es NO-GO.

5.8 Hotfix (incidente en producción) (Q-38)

1. Ante un incidente reportado (soporte general de la empresa, clientes o monitoreo), el PO o el LQA abre el ticket en Improvements: TYPE `Bug` , prioridad `urgent` , tags `hotfix` + `det-prod` y comentario C-32. ClickUp lo lleva a `to do` .
2. El PO y el LD autorizan el hotfix.
3. El Dev sigue `dev in progress` → `code review` → `ready for qa` con prioridad máxima; QA prioriza el `mock testing` .
4. En `ready to merge` , el SM crea el release extraordinario `Hotfix <producto> - vX.Y.Z+1` (`smoke` + `sanity` focalizado) y el RM ejecuta el corte.
5. DevOps despliega y QA hace el smoke maestro en producción con la company de prueba (C-31).

6. Plantillas de tarea

Para crear un ticket, usa el botón **Plantillas** de ClickUp y elige `SDLC T-01 · Request de Discovery`, `SDLC T-02 · Bug` o `SDLC T-03 · Mejora`. Para reportar un bug también puedes usar el **Form "Reportar bug — IOND"** de Improvements, que ya pide todos los datos. La plantilla T-04 la usa el SM para la tarea de Release.

13. Plantillas de tarea (descripción)

T-01 · Request de Discovery

```
## Problema / Necesidad
[Qué problema de negocio resolvemos y para quién]

## Historia de usuario
Como [rol], quiero [capacidad] para [beneficio].

## Criterios de aceptación (alto nivel — PO)
- [ ] ...

## Valor de negocio y prioridad
[Impacto, cliente o consumidor, urgencia]

## Stakeholders
@[SH]

## Fuera de alcance (preliminar)
- ...

## Matriz de Requerimientos v1
_(la completa QA en `requirements`)_

## Checklist de acuse (ClickUp checklist)
- [ ] Matriz de Requerimientos vN leída por el Dev
```

T-02 · Bug (Improvements / Form de intake)

```
## Resumen
[Qué falla, en una línea]

## Ambiente
- Producto / versión: [Iond vX.Y.Z | IonMind | StageMind] · Ambiente: [QA | preprod | producción] ·
Rama/commit: [..]
- Fase de detección: [det-*]

## Pasos para reproducir
1. ...

## Resultado esperado
[Qué debería pasar — cita el REQ-ID si existe]

## Resultado actual
[Qué pasa]

## Evidencia
[Capturas, logs, transaction_id, request/response]

## Impacto
[Usuarios o clientes afectados, workaround]
```

T-03 · Mejora (Improvements)

```
## Situación actual
## Mejora propuesta
## Criterio de aceptación breve
- [ ] ...
## Fuera de alcance
## ¿Requiere `requirements`? [Sí/No — decide PO/QA en backlog]

## Checklist de acuse (solo si pasa por `requirements`)
- [ ] Mini-matriz vN leída por el Dev
```

T-04 · Tarea de Release (`Release <producto> - vX.Y.Z`)

```
## Información general
| Campo | Valor |
|---|---|
| Producto / versión | |
| Repos y ramas RC | |
| Ambiente de validación | preprod-... |
| Tickets incluidos | [N] — relación + versión objetivo |
| Riesgo | Alto / Medio / Bajo — motivo |

## Prerrequisitos (bloqueantes)
- [ ] Repos desplegados en preprod desde el mismo commit RC
- [ ] Migraciones ejecutadas · variables nuevas configuradas
- [ ] Dependencias de otros productos desplegadas (IonMind / StageMind)
- [ ] Datos de prueba cargados · acceso de QA confirmado

## Suites
| Suite | Matriz / ejecución | Resultado |
|---|---|---|
| Smoke maestro (preprod) | smoke-preprod | |
| Sanity (REQ críticos por ticket) | sanity-matrix | |
| Regression capa 1 (riesgo + cross-system) | regression-matrix | |
| E2E maestro capa 2 (automatizado + grupo G[n]) | e2e-run | |
| Smoke maestro (producción, company de prueba) | smoke-prod | |

## Hallazgos
| ID | Severidad | Fase | Decisión (fix-forward / Improvements / diferido) |

## Go / No-Go
[criterios — ver C-29]

## Despliegue y post-despliegue
[C-30 / C-31]
```

7. Plantillas de comentario

Copia la plantilla, completa los `[...]` y publícala **en el ticket** antes de mover el estado o al mismo tiempo.

Las que más vas a usar:

Si eres...	Plantillas habituales
Dev	C-03 (R&D concluido) · checklist de acuse de la matriz (dudas en C-07) · C-09 (handoff a QA) · C-15 (escalamiento) · C-20 / C-21 (bloqueo y desbloqueo)
QA	C-05 (solicitud de VoBo) · C-08 (cambio de alcance) · C-13 (aprobación) · C-14 (rechazo) · C-17 (hallazgo fuera de matriz) · C-25 a C-28 (Release)
Lead Dev	C-02 (assignment) · C-11 (resultado del Code Review)
Lead QA	Reviewer QA en el C-02 (`assignment`) · C-12 (confirmación en `ready for qa`) · voto en C-29

14. Plantillas de comentario por transición

> Se copian tal cual en ClickUp. `[...]` = completar. Los comentarios **se publican en el ticket** antes o al momento de mover el estado.

Discovery — definición

C-01 · `idea/request` → `assignment` (PO)

```
## ✅ REQUEST REFINADO → ASSIGNMENT
**PO:** @[po] · **Prioridad:** [urgent/high/normal/low]
**Valor de negocio:** [1–2 líneas]
**Stakeholders:** @[sh]
**Criterios de aceptación de alto nivel:** ver descripción.
@[lead-dev] por favor asignar.
```

C-02 · `assignment` → `r, d & architect review` (LD, con el QA que asigna el LQA)

```
## 👤 ASSIGNMENT
**Asignado a:** @[dev] · **Dev Reviewer:** @[reviewer] · **Reviewer QA:** @[qa] (LQA) · **Tamaño:** S / M / L
**Foco de la investigación:** [preguntas técnicas a resolver]
**Timebox R&D:** [fecha]
```

C-03 · `r, d & architect review` → `prototype review` (Dev + aprobación LD)

```
## 🔬 R&D CONCLUIDO
**Opciones evaluadas:** 1) ... 2) ...
**Recomendación:** [...]
**Repos afectados:** [...] · **Contrato API (borrador):** [link]
**Dependencias:** [...] · **Riesgos:** [...] · **Requisitos no funcionales:** [...]
**Aprobación LD:** ✅ @[lead-dev]
```

C-04 · Acta de `prototype review` (SM/PO)

```
## 🧩 PROTOTYPE REVIEW — ACTA
**Asistentes:** PO @[..] · Dev @[..] · QA @[..] · LD @[..] · (SM / SH)
**Prototipo revisado:** [link wireframe / OpenAPI / diseño de board]
**Decisiones:** 1) ... 2) ...
**Contrato de interfaz aprobado:** [versión/link] — forma parte de la línea base.
**Pendientes para requirements:** [...]
**Resultado:** ✅ Aprobado → REQUIREMENTS / ❌ Volver a R&D (motivo)
```

C-05 · Solicitud de VoBo (QA → PO)

```
## 📋 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS v[N] LISTA PARA VoBo
@[po] la matriz está en la descripción (sección "Matriz de Requerimientos v[N]").
- REQ totales: [N] · Críticos: [N] · Fuera de alcance: [N]
- Puntos que requieren tu decisión:
  1. [pregunta + opción recomendada]
- ¿Requiere UAT? [Sí/No — recomendación de QA; decide el PO]
SLA de VoBo: 24 h hábiles. @[dev] cuando la leas, marca el checklist de acuse del ticket.
```

C-06 · VoBo del PO

```
## ✅ VoBo PO — Matriz de Requerimientos v[N]
Apruebo la matriz v[N] como criterio de aceptación de este ticket.
Decisiones sobre los puntos abiertos: 1) [...]
UAT: [requerido / no requerido]
```

C-07 · Dudas del Dev sobre la matriz (opcional)

```
## ❓ DUDAS SOBRE LA MATRIZ v[N] — @[dev]
1. REQ-[xx]: [duda]
> El acuse de lectura se registra marcando el checklist del ticket (Q-23).
```

C-08 · Cambio de alcance (matriz v+1)

```
## 🔁 CAMBIO DE ALCANCE — Matriz v[N] → v[N+1]
**Solicitado por:** @[po] · **Motivo:** [...]
| REQ | Antes | Ahora |
|---|---|---|
@[po] se requiere nuevo VoBo antes de modificar el código.
```

Discovery / Improvements — construcción y validación

C-09 · Handoff del Dev (*Changes and Specifications Form for QA*)

```
## 📦 CHANGES AND SPECIFICATIONS FORM FOR QA
**Resumen del cambio:** [...]
**REQ cubiertos:** REQ-01 ... REQ-0N
**Repos / ramas / PRs:** [repo] — [rama] — [PR]
**Instrucciones para QA:** migraciones [sí/no] · variables [..] · comandos [..] · datos de prueba [..]
**Pruebas unitarias:** [comando] — [N] agregadas — ✅ PASSED · cobertura [..]
**Riesgos o zonas sensibles:** [...]
```

C-10 · Acta de `pilot presentation` (SM)

```
## 🎬 PILOT PRESENTATION — ACTA
**Asistentes:** SH · PO · LD · QA · Dev
**Visto bueno preliminar:** ✅ / ⚠️ con ajustes
**Ajustes:**
| # | Ajuste | Tipo | Tratamiento |
|---|---|---|---|
| 1 | [...] | Contradice matriz / Nuevo imprescindible / Nuevo no imprescindible | Corregir en ticket /
Cambio de alcance (C-08) / Ticket nuevo #[id] (`pilot-feedback`) |
→ CODE REVIEW
```

C-11 · Resultado de Code Review (LD)

```
## CODE REVIEW APROBADO ✅   |   ## CODE REVIEW RECHAZADO ❌
**PR(s):** [...] · **CI:** ✅/❌ · **Análisis estático:** ✅/❌/N.A.
**Observaciones:** [...]
```

C-12 · `ready for qa` — confirmación del QA (LQA)

```
## 🍼 READY FOR QA
**Reviewer QA:** @[qa] · **QA Points:** [n] · **Ambiente:** [url] · **Build/rama:** [..]
**Inicio estimado:** [fecha]
```

C-13 · Aprobación de QA (`mock testing` → `uat` / `ready to merge`)

```
Estimado @[dev]
**El resultado de pruebas para este ticket es: APROBADO ✅**
**Matriz de Requerimientos:** v[N] (VoBo PO ✅)
| REQ | Resultado | Evidencia |
|---|---|---|
| REQ-01 | ✅ | [link] |
**TCs ejecutados:** [N] — ✅ [n] · ❌ 0 · ⏭️ [n] (justificación)
**Regresión de zonas cercanas:** ✅
**Hallazgos fuera de matriz (no bloquean):** [#id — `fuera-de-matriz`] / Ninguno
**Ambiente / rama / PRs:** [...]
→ [UAT | READY TO MERGE]
```

C-14 · Rechazo de QA (`mock testing` → `to do`)

```
Estimado @[dev]
**El resultado de pruebas para este ticket es: RECHAZADO ❌** — Iteración [N] (Rejection_count → [N])
**Matriz de Requerimientos:** v[N]
### OBS-01 — [urgent/high/normal/low] — REQ-[xx] — Estado: Nuevo / Persistente / Regresión
**Área / Flujo:** [...]
**Pasos:** 1. ...
**Resultado esperado (según REQ-[xx]):** [...]
**Resultado actual:** [...]
**Evidencia:** [...]
---
**Hallazgos fuera de matriz (no son causa de rechazo):** [#id]
**Ambiente / rama / PRs:** [...]
→ TO DO
```

C-15 · Escalamiento de desacuerdo (QA o Dev)

```
## ⚖️ ESCALADO AL PO — decisión requerida (SLA 4 h hábiles)
**Punto en discusión:** REQ-[xx] / [comportamiento]
**Postura QA:** [1–2 líneas]
**Postura Dev:** [1–2 líneas]
**Impacto si no se decide:** [...]
@[po]
```

C-16 · Decisión del PO

```
## 🧭 DECISIÓN PO
**Sobre:** [punto] · **Decisión:** [...]
**Efecto:** [es bug del ticket / se acepta el comportamiento / cambio de alcance (C-08) / ticket nuevo #id]
```

C-17 · Hallazgo fuera de matriz

```
## 📝 HALLAZGO FUERA DE MATRIZ (no bloquea este ticket)
**Observación:** [...] · **Por qué está fuera:** [no contemplado en REQ / listado en Fuera de alcance]
**Ticket creado:** #[id] (`fuera-de-matriz`) — prioridad a decidir por @[po]
```

C-18 · Resultado de UAT

```
## 🤝 UAT — [APROBADO ✅ / CON OBSERVACIONES ⚠️]
**Participantes:** [cliente / SH] · PO · QA · **Ambiente:** [..]
**Observaciones:** [contradice matriz → bug / nueva → ticket #id]
→ [READY TO MERGE | TO DO]
```

C-19 · `merged` (RM)

```
## 🔀 MERGED
**PR(s):** [...] → rama RC [nombre por repo] · **Conflictos:** ninguno / resueltos
**Versión:** [producto vX.Y.Z] · **Tarea de Release:** #[id]
```

C-20 · `blocked` — inicio y actualización diaria

```
## ⛔ BLOQUEADO — [bloq-externo / bloq-ambiente / bloq-definicion / bloq-dependencia]
**Desde:** [fecha] · **Estado previo:** [estado]
**Impedimento:** [...] · **Depende de:** @[persona / equipo / ticket]
**Plan de acción:** [...] · **Próxima revisión:** [fecha]
```

C-21 · Desbloqueo

```
## ✅ DESBLOQUEADO — vuelve a [estado]
**Resolución:** [...] · **Tiempo bloqueado:** [h/días]
```

C-22 · `invalid` (PO)

```
## 🚫 INVALID
**Motivo:** [prioridad cambiada / obsoleto / duplicado de #id / otro: ...]
**Decidido por:** @[po]
```

Releases

C-23 · `dev preparation` concluido (RM)

```
## 🏗️ DEV PREPARATION — [producto vX.Y.Z]
**Corte:** [fecha hora] · **Tickets incluidos:** [N] (relación) · **Diferidos:** [#ids]
**Ramas RC:** [repo → rama] · **Builds:** ✅ · **Preprod:** desplegado [commit]
**Prerrequisitos verificados:** ✅ (ver checklist)
```

C-24 · `unit test & ci`

```
## ⚙️ UNIT TEST & CI — [✅ verde / ❌ fallas]
| Repo | Pipeline | Resultado |
```

C-25 / C-26 / C-27 · `smoke` / `sanity` / `regression` (QA)

```
## 💉 [SMOKE | SANITY | REGRESSION] — [producto vX.Y.Z] — [✅ / ❌]
**Ejecutados:** [N] · ✅ [n] · ❌ [n] · ⏭️ [n] · **Automatizados:** [n]
**Hallazgos:** [ID — severidad — decisión: fix-forward / Improvements #id / diferido]
**Evidencia / matriz:** [link]

<!-- Solo en SANITY (C-26) -->
**Por ticket:** [#id → REQ críticos n/n ✅ / ❌] · **Interacciones:** [SAN-INT-xx]

<!-- Solo en REGRESSION (C-27) -->
**Capa 1 (riesgo):** [n/n] · flujos críticos [✅ / ❌]
**Capa 2 (E2E maestro):** automatizado [n/n] · rotación G[n] [n/n] · inestables en cuarentena [n]
```

C-28 · Bug en RC / fix-forward

```
## 🩹 FIX-FORWARD — [ID] (urgent)
**Detectado en:** [smoke/sanity/regression] · **Ticket origen:** #[id]
**Decisión:** PO @[..] + LD @[..] — fix en la rama RC · **Plazo:** [..]
**PR del fix:** [...] · **Re-verificación QA:** [pendiente / ✅]
```

C-29 · Acta Go / No-Go (`ready for release`)

```
## 🚦 GO / NO-GO — [producto vX.Y.Z]
**Decisión:** 🟢 GO / 🟡 CONDITIONAL GO / 🔴 NO-GO
**Votos:** PO @[..] [✅/❌] · LQA @[..] [✅/❌] · RM @[..] [✅/❌]
**Resultados:** Smoke [..] · Sanity [..] · Regression capa 1 [..] · E2E capa 2 [..]
**Hallazgos abiertos:** [ID — severidad — aceptado por PO / workaround]
**Release notes:** [interna] · [cliente]
**Rollback:** plan verificado ✅ · **Ventana de despliegue:** [fecha hora] con DevOps
```

C-30 · Despliegue ejecutado (RM)

```
## 🚀 DEPLOYED — [producto vX.Y.Z] — [fecha hora]
**Ejecutó:** DevOps @[..] · **Coordinó:** RM @[..]
**Repos / versiones:** [...] · **Incidencias:** ninguna / [...]
```

C-31 · Validación post-despliegue

```
## 🔎 POST-DEPLOY — [✅ estable / ❌ incidente]
**Smoke en producción (company de prueba):** [n/n] · **Limpieza de datos:** ✅ · **Monitoreo 48 h:** [en curso / OK]
**Incidentes:** [#id hotfix]
```

C-32 · Apertura de hotfix (PO / LQA)

```
## 🔥 HOTFIX — [producto] — prioridad urgent
**Incidente:** [...] · **Clientes afectados:** [...] · **Workaround:** [...]
**Autorizan:** PO @[..] · LD @[..] · **Release extraordinario:** Hotfix [producto] vX.Y.Z+1
```

Improvements — triage

C-33 · `backlog` → `to do` / `requirements` (PO/SM)

```
## 🗂️ TRIAGE
**Prioridad:** [..] (bug = severidad) · **¿Requiere requirements?:** Sí / No
**Clasificación confirmada:** Improvements ✅ / reclasificar a Discovery
```

8. Tags que puedes usar

En los tableros SDLC **solo** se usan estos tags. No uses tags de sprint, de despliegue ni de hito (`iond-depl-*` , `iond-mvp` , `iond-beta` , `qa-*` , `sp*`), ni `for-analysis` , ni tags de producto (`iond` , `ionmind` , `stagemind`): esa información va en el estado, en el campo Project o en el campo de versión.

Tag	Cuándo	Quién
`iond-core` · `iond-uxui` · `iond-infra` · `iond-ia`	Al crear un ticket de iond: uno, según la capa principal del cambio	Creador / LD
`po-vobo`	Cuando el PO publica el VoBo (C-06)	QA (o PO)
`uat-requerido`	El ticket necesita UAT antes del merge (se decide en `requirements`)	PO
`cambio-alcance`	La matriz cambió después del VoBo (v+1)	QA
`escalado-po`	Hay un desacuerdo esperando la decisión del PO	QA o Dev
`fuera-de-matriz`	Ticket nuevo nacido de un hallazgo fuera de la matriz	QA
`pilot-feedback`	Ticket nuevo nacido de un ajuste del Pilot	SM
`bloq-externo` · `bloq-ambiente` · `bloq-definicion` · `bloq-dependencia`	Al mover a `blocked` ; se retira al desbloquear	Quien bloquea
`det-mock` · `det-uat` · `det-smoke` · `det-sanity` · `det-regression` · `det-prod` · `det-exploratorio`	Al reportar un bug: fase en la que se detectó	Quien reporta
`hotfix`	Incidente en producción	PO / LQA
`fix-forward`	Subtarea de corrección dentro de la RC	QA / RM
`diferido`	Ticket revertido de la RC o pasado a la siguiente versión	RM

9. Qué hacen las automatizaciones por ti

ClickUp no impide mover un ticket a cualquier estado, así que algunas reglas se aplican **después** del movimiento: ClickUp devuelve el ticket y te deja un comentario. Las automatizaciones se activan de forma progresiva; si alguna todavía no está activa, **la regla se aplica igual** y el SM la revisa en su auditoría.

Si tú…	ClickUp…	Qué haces
Creas una tarea en Discovery	Aplica la plantilla T-01 y agrega al PO como watcher (A-01)	Completa la plantilla y los campos
Creas una tarea o envías el Form en Improvements	Aplica T-02 (bug) o T-03 (mejora) y agrega al SM (A-02)	Completa la plantilla
Mueves de `requirements` a `to do` sin `po-vobo`	**Lo regresa** a `requirements` y comenta (A-03)	Espera el VoBo del PO (C-06)
Agregas `cambio-alcance`	Quita `po-vobo` y avisa al PO (A-04)	Espera el nuevo VoBo
Entras a `requirements`	Recuerda los plazos de la matriz y del VoBo (A-05)	—
Mueves a `code review` sin Merge Request	**Lo regresa** a `dev in progress` y comenta (A-06)	Registra el PR y vuelve a moverlo
Entras a `code review`	Avisa al Dev Reviewer (A-07)	—
Entras a `ready for qa` (o, en Discovery, a `r, d & architect review`) sin Reviewer QA	Avisa al LQA para asignarlo (A-08)	—
Rechazas (de `mock testing` o `uat` a `to do`)	Te recuerda publicar C-14 y actualizar Rejection_count (A-09)	Hazlo, si aún no lo hiciste
Apruebas un ticket con `uat-requerido` hacia `ready to merge`	Lo mueve a `uat` y avisa al PO (A-10)	Acompaña la UAT
Entras a `ready to merge` sin versión objetivo	Avisa al RM y al SM (A-11)	—
Mueves a `blocked`	Publica la plantilla C-20, agrega al SM y fija el vencimiento a 2 días (A-12)	Completa el C-20 y el tag `bloq-*`
Dejas un ticket 48 h en `blocked`	Escala al SM y al LD (+ PO si es `bloq-definicion`) (A-13)	Actualiza el plan
Cierras todas las subtareas	Avisa al dueño del ticket padre (A-14)	Avanza el padre
Agregas `escalado-po`	Avisa al PO: decisión en 4 h hábiles (A-15)	Sigue con los REQ no afectados
Mueves a `invalid`	Pide el motivo obligatorio (A-16)	El PO publica C-22
Alguien agrega `hotfix`	Prioridad `urgent`, estado `to do` y aviso a PO, LD y RM (A-17)	Prioriza el ticket
Cambia el estado de la tarea de Release	Publica la plantilla del comentario de ese estado (A-18)	Complétala
Agregas `det-prod`	Avisa al LQA y al LD/RM (A-19)	—

10. Severidad

La severidad de un bug se expresa con la **prioridad nativa** de ClickUp.

10. Severidad de hallazgos (prioridad nativa de ClickUp)

Prioridad	Severidad	Definición	Efecto en `mock testing`	Efecto en el Release
`urgent`	**Bloqueante**	Funcionalidad core rota sin workaround; pérdida o corrupción de datos; seguridad; cobro incorrecto	Rechazo	**Fix-forward** obligatorio o NO-GO
`high`	Alta	Funcionalidad importante falla con workaround	Rechazo si incumple un REQ	CONDITIONAL GO solo si el PO acepta el riesgo y se agenda el fix
`normal`	Media	Funcionalidad secundaria o UX con impacto moderado	Rechazo si incumple un REQ; si es fuera de matriz, ticket nuevo	No bloquea; ticket en Improvements
`low`	Baja	Cosmético	Rechazo solo si incumple un REQ explícito	No bloquea

> En tickets que no son bugs, la prioridad expresa la **prioridad de negocio** (la define el PO).

Para elegir bien la severidad:

- Pregúntate primero si hay **workaround**: sin workaround en una funcionalidad core, es `urgent`; con workaround, normalmente `high`.
- Pérdida o corrupción de datos, problemas de seguridad y cobros incorrectos son siempre `urgent`.
- La severidad no decide si un hallazgo es motivo de rechazo: eso lo decide la matriz. Un `low` que incumple un REQ explícito se rechaza; un `high` fuera de la matriz va a un ticket nuevo.

11. Preguntas frecuentes

1. ¿Qué hago si el PO no da el VoBo a tiempo? El ticket se queda en `requirements`. El VoBo tiene un plazo de 24 h hábiles: avisa al SM, que lo recuerda al PO y lo lleva a la daily si es necesario. Mientras tanto, no empieces a programar ese ticket: toma otro de `to do`.

2. ¿Puedo empezar a programar los REQ claros si uno está en duda? Sí, cuando la matriz ya tiene VoBo. Avanza con los REQ claros, escala el dudoso (C-15 + `escalado-po`) y no implementes tu propia interpretación del REQ en discusión hasta que el PO decida (C-16).

3. ¿Qué pasa si encuentro un bug que no está en la matriz? No es motivo de rechazo. Crea un ticket nuevo en Improvements con `fuera-de-matriz` y `det-*`, enlázalo y publica C-17 en el ticket original. El PO decide su prioridad (protocolo 5.6).

4. ¿Qué es `done w/d` y cuándo lo uso? Significa *Done With Dependencies*. Es el cierre de una **subtarea** técnica cuyo código ya está integrado en la rama del ticket padre. La subtarea no pasa por QA: QA valida el padre. Nunca se usa en un ticket padre. Cuando el padre pasa a `ready to merge`, la subtarea pasa también a `ready to merge` y luego a `merged` junto con él (automatización A-20 o, si no está disponible, el RM en el corte).

5. ¿Por qué ClickUp devolvió mi ticket a otro estado? Porque faltaba un requisito del gate: el VoBo del PO al pasar a `to do` (A-03) o el PR en Merge Request al pasar a `code review` (A-06). Lee el comentario automático, completa lo que falta y vuelve a mover el ticket.

6. ¿Cuándo pasa mi ticket a `merged`? ¿Tengo que moverlo al tablero de Releases? Lo mueve el RM durante `dev preparation`, cuando integra tus PR a la rama RC de la semana, y publica C-19. El ticket **no** se mueve a Releases: se queda cerrado en su kanban y la tarea de Release lo referencia.

7. ¿Un rechazo en `code review` cuenta en Rejection_count? ¿Después de un rechazo hay que volver a Pilot? No y no. Un rechazo en `code review` devuelve el ticket a `dev in progress` sin tocar Rejection_count, que solo cuenta los rechazos de QA. Después de un rechazo de QA, el ticket no vuelve a `pilot presentation`.

8. Mi cambio toca más de cuatro repositorios. ¿Dónde registro los PR? Usa Merge Request, Merge Request 2, 3 y 4 para los cuatro principales y lista los demás en el C-09. Si pasa a menudo, coméntalo con el LD: puede ser señal de que el ticket debe dividirse.

9. ¿Puedo seguir usando tags como `iond-depl-*`, `iond-mvp` o `for-analysis`? No en los tableros SDLC. La versión va en Iond.Version, Ionmind.Version, Stagemind.Version o G.Version (según el Project); el análisis se refleja con el estado; el producto, con el campo Project. Usa solo los tags de la sección 8.

10. Una mejora de Improvements necesita validación del cliente. ¿Qué hago? Es una señal de que pertenece a Discovery (Q-30). Avisa al PO, que decide si la reclasifica a Discovery (`idea/request`) o si se valida de otra forma sin agregar UAT en Improvements.
